



**T.C**  
**İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ**  
**ENSTİTÜSÜ**

2015 Yılı Yatırım Programı  
İzleme ve Değerlendirme Raporu

# İÇİNDEKİLER

<b>1. YÖNETİCİ ÖZETİ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME</b> .....	<b>4</b>
2.1. MİSYON .....	4
2.2. VİZYON .....	4
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ .....	4
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	4
2.5. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT HİZMET / ÜRETİM KAPASİTESİ .....	5
2.6. 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE - KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME .....	9
2.7. 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	9
<b>3. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI</b> .....	<b>11</b>
3.1. DEVAM EDEN PROJELER .....	11
3.1.1 <i>Kamu Yatırım Projeleri</i> .....	11
3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı.....	11
3.1.1.2 2015H032720 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	11
3.1.1.3 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı).....	12
3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler .....	12
3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	12
3.1.1.6 Kamulaştırma .....	13
3.1.1.7 2015H032730 Muhtelif İşler .....	13
3.1.2 <i>İzmir Kalkınma Ajansı Desteği İle Yürütülen Projeler</i> .....	16
<b>4. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK</b> .....	<b>16</b>
4.1. ÖNERİLER.....	16
4.2. 2015 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU.....	17
4.3. 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU .....	18

**İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**2015 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluşunda tanımlanan “ **Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak**”, misyonuna sahip olan ve eğitim-öğretim politikası ile yatırım politikalarını bu doğrultuda oluşturmaya önem veren Enstitümüze 2015 Yılı Yatırım Programı ile toplam 21.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Yatırım programında yer alan yapım işleri projelerinden, 2013 yılında yapımına başlanılan, 3.762 m<sup>2</sup> lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu 2015 yılında hizmete girmiş, 2013 yılında yapımına başlanılan, 6.250 m<sup>2</sup> lik alana sahip olacak Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı da 2015 yılında tamamlanarak, kabul işlemlerine başlanılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile sürdürülen 7.510 m<sup>2</sup> lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına 2015 yılında devam edilmiştir.

Teknoloji transferi faaliyetlerinin kapsamlı ve tek bir çatı altında yürütülmesi amacı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Transfer Ofisi, TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO) Destekleme Programı kapsamında İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş ile ortak sunulan proje ile 10 yıl süreli desteklenmeye hak kazanmıştır. 2013 yılında kuruluşunu tamamlayan İYTE ATMOSFER Teknoloji Transfer Ofisi, 2015 yılında da kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

Enstitümüz, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralandığı, ulusal ölçekte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin üst basamaklarındaki yerini koruyarak 2012 yılı sıralamasında 7., 2013 yılında 6., 2014 yılında 9., 2015 yılında ise 8. sırada yer alarak, ulusal ve uluslararası ölçekte “araştırma üniversitesi” olma yolunda yetkin bir kimlik kazanmış bulunmaktadır.

Enstitümüz öğretim üyelerinin devam eden projelerinin yanı sıra 2015 yılında, bir AB projesi ile 35 TÜBİTAK projesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Enstitümüz yedi adet tematik araştırma merkezine sahip bulunmaktadır. Merkezlerin altyapı desteği ile yürütülen projeler kapsamında, 2014 yılında Güney Doğu Anadolu (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında yapılan sözleşme kapsamında, Güneydoğu Anadolu’daki jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik araştırma projesi Aralık /2015 tarihinde tamamlanmış, bu projeye yönenin jeotermal yönden kalkınmasının yolu açılmıştır. Ayrıca, Avrupa ülkelerinden 50 ortaklı bir AB projesi olan Avrupa Komisyonu’nun açık erişim politikalarının uygulanmasını ve etkisinin güçlendirilmesini kapsayan OpenAIRE2020 projesinde Türkiye’den sadece İYTE Kütüphanesi ortaklar arasında yer almıştır.

2015 yılında, Mimarlık Fakültesi bünyesinde İzmir’in tasarım vizyonunu ileriye taşımaya hedefleyen mimarlık, şehir ve bölge planlama, mimari restorasyon, endüstri ürünleri tasarımı ve ilgili diğer konularda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, üniversitede öğretilen bilgiyi toplumla buluşturmak amacıyla **Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin** açılışı da gerçekleştirilmiştir. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmaları 2015 yılında da ödüle değer bulunmuştur. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÖKSAL Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödülüne, Cenevre Uluslararası Buluş Fuarı’na katılmak için Türkiye’den seçilen üç isimden biri olan İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Devrim Pesen OKVUR’da 43. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı’nda altın madalya almaya hak kazanmıştır.

Eğitim-öğretim alanında lisansüstü eğitim ve araştırma alanlarında büyüme stratejisini sürdüren Enstitümüzde, lisansüstü eğitim vermek üzere Fotonik Bölümü ile lisans eğitimi vermek üzere Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2015 Yılı Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2015 yılında yaşanan gelişmelerin ışığında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1.Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

### 2.2 Vizyon

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

### 2.3 Temel Değerlerimiz

“Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır. Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz;

- Bilimsel araştırma,
- Eğitim-öğretim,
- Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık,
- Kurumsal gelişim,
- Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır.


### 2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları

Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

Enstitümüze 2015 yılı Yatırım Programında toplam 7 proje için 21.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen ekleme işlemleri ile bu tutar 22.629.925.-TL'ya ulaşmış ve toplam 12.427.560.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

#### Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Dağılımı

Teknolojik Araştırma	1.000.000.-	%4,76
Eğitim	19.000.000.-	% 90,48
Mamul Mal Alımları .....	4.000.000.-	
Gayri Maddi Hak Alımları .....	400.000.-	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.....	14.100.000.-	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.....	500.000.-	
Spor	1.000.000.-	% 4,76
Toplam	21.000.000.-	% 100



## 2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Enstitümüz kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane'deki iki binada, yaklaşık 5.500 m<sup>2</sup> lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde İzmir'e 45 km, Urla'ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 35.000 dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla / Gülbahçe Köyü'ndeki Kampüse taşınmıştır. 2008 yılında Alsancak' taki binada eğitim vermeye devam eden Yabancı Diller Bölümünün kampüse taşınması ile Gülbahçe Kampüsü yerleşimi tamamlanmıştır.

2015 yılı itibariyle yerleşkedeki yapılaşma; Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumuna ait 15.270 m<sup>2</sup> alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait yapılaşma ile toplam 186.767 m<sup>2</sup> lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca "İYTE Yaşam Merkezi" inşaatı 2014 Ekim ayı itibariyle hizmete girmiş olup 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlamaktadır. 2012 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan 16.253 m<sup>2</sup> lik İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası Ağustos 2014 tarihinde ve 2013 yılında yapımına başlanılan 3.762 m<sup>2</sup> lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu inşaatı Eylül 2015 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir. 2013 yılında başlanılan 6.250 m<sup>2</sup> lik alana sahip olacak Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaatı 2015 yılı sonunda tamamlanmış olup, kabul işlemleri devam etmektedir.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında 2015 yılında, İZKA destekli 7.510 m<sup>2</sup> lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına devam edilmiştir.

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m <sup>2</sup>											
	HİZMETE ALINIŞ TARİHİ	İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLASYON ALANI	SPOR ALANLARI		TOPLAM	
			DERSLİK	LAB.	KANTİN/ KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR		AÇIK SPOR TESİSLERİ	KAPALI SPOR TESİSLERİ		
<b>MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</b>												
DEKANLIK		260						30			290	
GIDA MÜHENDİSLİĞİ		350	41	525				0			916	
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ	2015	4536	1033	4179				7867			17.615	
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ		441	306	362				650			1.759	
ELK.-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ	2000	440	691	1152				307			2.590	
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ	2005	1076	758	4258		377		3531			10.000	
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ	2009	737	1139	2230		271		5900			10.277	
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ATÖLYELER	2001	482	0	1770		0		700			2.952	
<b>MİMARLIK FAKÜLTESİ</b>												
DEKANLIK	2006	2378						811			3.189	
MİMARLIK	2004	834	640	334				711			2.519	
ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA	2002	834	640	334				711			2.519	
MİMARİ RESTORASYON	1999	834	640	334				711			2.519	
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIM	1999	834	640	334				711			2.519	
<b>FEN FAKÜLTESİ</b>											0	
DEKANLIK	1999	806						250		214	1.270	
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK	2012	7868	500	4060		150		3955			16.533	
FİZİK	2007	874	820	1373		229		1813			5.109	
KİMYA	2000	808	282	2434				1181			4.705	
MATEMATİK	2011	3035	995	315		75		2325			6.745	
<b>REKTÖRLÜK</b>											0	
REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM	1999	315						145			460	
GENEL SEKRETERLİK	1999	2104						478			2.582	
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	1999	261						108			369	
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	244						93			337	
SKS DAİRE BAŞKANLIĞI	2006	5578		320		6413		1667	7510	10417	31.905	
KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI	2006	3165		190				2625			5.980	
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	263						119			437	
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	322						115			437	
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	2000	924						93			1.017	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1999	100									100	
GENEL KÜLTÜR DERSLERİ BÖLÜMÜ	2006	236						79			315	
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ	2000	522	3078			391		2334			6.325	
DÖNER SERMAYE	2000	105						24			129	
İÇ DENETİM	2000	18									18	
LOJMANLAR	2002						4280				4.280	
<b>MÜH. VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ</b>	2000	205	0					100			305	
<b>BİLGİSAYAR UYG. ARAŞTIRMA MERKEZİ</b>	2006	80		250				166			496	
<b>MALZEME ARAŞTIRMA MERKEZİ</b>	2000	1903		1919		13		3156			6.991	
<b>SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ</b>		30									30	
<b>JEO.ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYG.MERKEZİ</b>	2002	72									72	
<b>ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ</b>		10									10	
<b>YURTLAR</b>	2005	2327				900	1150	9750			14.127	
<b>ÇEVRE ARGE</b>	2002	381		392				177			950	
<b>TEKNOPARK</b>		7914						478			8.392	
<b>BİYOTEKNOLOJİ GEO</b>		118		236				230			584	
<b>SAV-TAG AR-GE</b>	2012	1878,5									0	
<b>ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MER.</b>	2011	484,56									0	
<b>A9 ARGE BİNASI</b>	2013	2250									0	
<b>A8 KULUÇKA BİNASI</b>	2013	1480									0	
<b>İNOVASYON BİNASI</b>	2014										0	
<b>GENEL TOPLAM</b>		60.717	12.203	27.301		8.819	5.430	9.750	44.351	7.510	10.631	186.767

## Yerleşim Durumu

İdari Bina Alanları (m <sup>2</sup> )	Eğitim Alanları (m <sup>2</sup> )		Sosyal Alanlar (m <sup>2</sup> )			Sirkülasyon Alanı (m <sup>2</sup> )	Spor Alanları (m <sup>2</sup> )		Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
	Derslik	Laboratuvar	Kantin Kafeterya	Lojman	Yurtlar		Açık	Kapalı	
60.717	12.203	27.301	8.819	5.430	9.750	44.351	7.510	10.631	186.767

## Eğitim ve Uygulama Alanları

	Kapasitesi						Genel Toplam
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251-Üzeri	
Amfi	1	2	2	1		1	7
Sınıf	107	17	2				126
Bilgisayar Laboratuvarları	17						17
Diğer Laboratuvarlar	123		1				124
Toplantı Salonu	19		1				20
Konferans Salonu	5	1	1		1		8
<b>Toplam</b>	<b>272</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>302</b>

## Kantinler ve Kafeteryalar

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)
Kantinler	10	2.150	
Merkezi Kafeterya	1	4.526	5.000
Öğrenci Yemekhanesi *	3	1.845	2.500
<b>Toplam</b>	<b>14</b>	<b>8.521</b>	<b>7.500</b>

## Spor Tesisleri

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)
Kapalı Spor Tesisi	1	10.631	1.200
Açık Spor Tesisleri	8	7.510	
Kapalı Yüzme Havuzu	1	3.762	265
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>21.903</b>	<b>1.465</b>

## Öğrenci Yurtları

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak brüt 15.136 m<sup>2</sup> lik kapalı, yaklaşık 20.000 m<sup>2</sup> (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil) açık alana, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt "örnek yaşam köyü" yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişilik kapasiteli öğrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay-bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır.

	Yatak Sayısı (2 kişilik )
Oda Sayısı	344
Alanı m <sup>2</sup>	14.127 m <sup>2</sup>

## Lojmanlar

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Dolu Lojman Sayısı
Lojmanlar	48	4.280	48

## İYTE Yaşam Merkezi

Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek amacıyla içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan 18.554 m<sup>2</sup> lik alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.

## Mevcut Taşıtlar

TAŞITIN CİNSİ	İYTE	Vakıf
Binek Otomobil (Tenezzüh)	4	3
Binek Otomobil (Station)	2	
Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi)	1	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi)	1	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi)	1	
Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişi)	1	
Traktör	1	
İtfaiye Aracı	1	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi)		1
Kamyonet	1	1
Kamyon		1
İş Makinası	1	
Arazi Jeep		1
Pic-up (Şöför dahil 6 kişilik)		1
<b>TOPLAM</b>	<b>14</b>	<b>8</b>



## 2.6. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

2015 yılında, Kampüs altyapı inşaatları kapsamında 7 adet proje tamamlanmıştır. 6.250 m<sup>2</sup> lik Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaatı ile 2013 yılında yapımına başlanılan 3.762 m<sup>2</sup> lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu inşaatları teslim alınmıştır. 2015 yılında inşaatına başlanan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %22, Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %96, 2013 yılında yapımına başlanan Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının fiziki gerçekleşme oranı ise %100 seviyesine ulaşmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, İZKA destekli 7.510 m<sup>2</sup> lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına da devam edilmektedir.

## 2.7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 1.000.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektöründe, 19.000.000.-TL Eğitim Sektöründe, 1.000.000.-TL Spor Sektöründe olmak üzere toplam 21.000.000.-TL ödenek verilmiştir.

2015H032720 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 68.440.- TL yüklenme avans artığı, 1995H030670 Kampüs Altyapısı Projesine 30.000.-TL, 2014H031450 Muhtelif İşler Projesine 1.024.955.- TL (bilgisayar alımı için 20.000.-TL, bilgisayar yazılımı alımı için 154.955.-TL, büyük onarım alımı için 850.000.-), kamulaştırma bedeli olarak 409.490.-TL olmak üzere 1.532.885.- likit fazlası ödenek eklenmiştir.


2014 yılından devreden 97.040.- TL akreditif artığı da dâhil olmak üzere yılsonu genel ödenek toplamı % 7,76 artışla 22.29.924,60 TL olmuştur. Sermaye giderleri ödeneklerinin 12.427.559,62 TL 'si harcanmış, 5018 sayılı Kanununun 35 nci maddesi gereğince 4.736,25.- TL'si akreditif artığı olarak ertesi yıla devredilmiştir.

2015 Yılı Bütçesi yatırım gerçekleştirmeleri incelendiğinde; yatırım harcamalarının Bütçemizde % 26,49 paya sahip olduğu ancak, toplam 12.427.559,62- TL yatırım harcamasının % 43,52 'lik diliminin 5.408.953,02 TL sini, fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülecektir.

Projenin Adı	KBÖ Ödenegi	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
2014H031440 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	68		168	39	23
2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	12.000			12.000	2.882	24
1995H030670 Kampüs Altyapısı	2.000	30		2.030	1.863	92
2014H031450 Büyük Onarım	500	850		1.350	1.318	98
2014H031450 Muhtelif İşler	4.400	193	29	4.564	4.218	92
1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000			1.000	624	62
2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000			1.000	2.248	
Kamulaştırma		409		409	389	95

### Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı

Birim Adı	06.1 Mamul Mal Alımları	06.3 G.Maddi Hak Alımları	06.4 G.Menkul Alımları ve Kamulaştırma	06.5 G.Menkul Üretim Giderleri	06.7 G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	Harcama Toplamı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.156.120					2.156.120
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	999.931					999.931
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			389.020	4.784.833	1.318.243	6.492.096
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı				624.120		624.120
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	548.365	513.467				1.061.832
Rektörlük(BAP)	2.248.000					2.248.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.952.416</b>	<b>513.467</b>	<b>389.020</b>	<b>5.408.953</b>	<b>1.318.243</b>	<b>13.582.099</b>

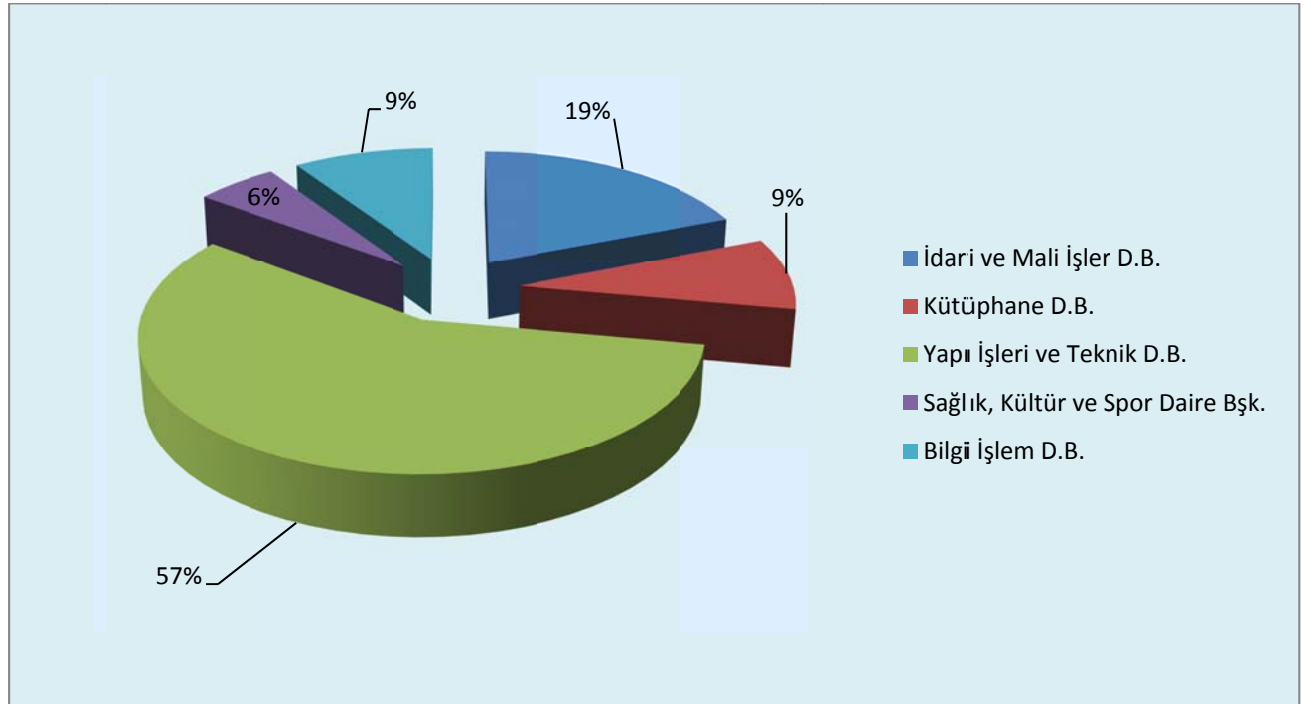

### 3. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 3.1. Devam Eden Projeler

##### 3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

###### 3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	2.500.000	450.000	4.000.000	5.330.000	3.000.000	2.000.000
Eklene (Likit)	800.000	430.000				30.000
Bütçe İçi Aktarma		3.000.000				
Düşülen						
Bloke						
Harcama	3.300.000	2.864.000	4.000.000	5.330.000	2.980.000	1.863.000

Proje bedeli, 1998 yılında yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil 4.800.000,00.-TL olarak belirlenmiştir. ( 3.939.565,00.-TL tenzilatlı) Sözleşme yılına göre 2015 yılı sonuna kadar toplam fiziki harcama 3.853.704,01.-TL(tenzilatlı) ve gerçekleşme oranı % 97,82 seviyesindedir. İlk ihale başlangıcından itibaren toplam proje maliyeti 81.000.000,00.-TL'dir. 2015 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 81.385.747,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 98,68 olmuştur. Kasım 2015'de Altyapı İkmal ve Dere Yatakları İnşaatlarının kesin hak edişleri hazırlanarak, ödemeleri yapılmıştır. Altyapı İkmal İnşaatı için 2015 yılında 1.447.747,00.-TL ödenek sağlanmıştır.

###### **2015 yılı Altyapı Projesi kapsamında;**

4900 m<sup>2</sup> düzenleme alanı içerisinde istinat perdesi yapılması, otopark yapılması, yeşil alanlar, çevre düzenlemesi ve su sondaj kuyusu açılması işleri açık ihale usulü ile 01.09.2015 tarihinde ihale edilmiş, yıl sonuna kadar işin % 65,21 i tamamlanmıştır. İhale kapsamında yapılması gereken işlerin tamamlanabilmesi için bu iş için ayrılan ödenek 2016 yılına aktarılmıştır.

Kampüs ana yollarında mevcut bulunan demir yağmur ızgaralarına ilave lama kaynatılması işi 2015 yılında tamamlanmıştır.

###### 3.1.1.2 2015H032720 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	50.000	50.000	98.000	98.000	100	100
Eklene ( Likit )			232.000			68
Bütçe İçi Aktarma						
Düşülen						
Harcama	( - )	13.000	118.000	46.000	20	39

2015 yılında yapılan etüd proje harcamaları	Tutar (TL)
Zeytinler Urla-İzmir mevkiinde bulunan 16.863,30 m <sup>2</sup> 'lik ormanlık sahada kurulması planlanan 250 KW'lık rüzgar enerjisi santrali için elektrik projesi hazırlanmasına ait mühendislik ve danışmanlık hizmetleri	21.240,00
İYTE Engelli erişim projelendirme ve yaklaşık maliyet hesaplanması	18.113,00
<b>Toplam Harcama</b>	<b>39.353,00</b>

### 3.1.1.3 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	400.000	2.000	1.200.000	2.500.000	2.400.000	1.000.000
Eklenen (Likit)		10.000			1.440.000	
Bütçe İçi Aktarma	389.000					
Düşülen						
Harcama		11.830		1.577.998	3.799.000	624.000

Proje için 2015 Yılı Yatırım Programı ile 1.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası inşaatına 05/04/2013 tarihinde başlanmıştır. İnşaatın geçici kabul işlemleri tamamlanarak 2015/Ağustos ayında hizmete alınmıştır. 2015 yılı sonuna kadar 624.120,15 TL harcama yapılmıştır.

Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatının toplam proje tutarı 6.000.000.-TL' dir. 2015 yılı sonuna kadar harcama 456.007,90 TL ve toplam kümülatif harcama ise 5.045.007,90 TL'dir. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 84,08 olmaktadır.

### 3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	5.399.000	6.000.000	9.500.000	12.000.000
Eklenen (Likit)		1.502.000	1.750.000	
Bütçe İçi Aktarma				
Düşülen				
Bloke				
Harcama	500.400	7.502.000	8.701.000	2.882.000

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatına 30/07/2015 tarihinde başlanılmış, 2015 yılı sonuna kadar temel, dolgu perdeleri, su basman ve zemin kat perde ve kolon betonarme imalatları tamamlanmıştır. 2015 yılı sonuna kadar 2.882.000.-TL harcama gerçekleşmiştir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası inşaatına ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

### 3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	3.000.000	5.000.000	3.150.000	1.000.000
Eklenen (Likit)				
Bütçe İçi Aktarma				
Düşülen				
Bloke				
Harcama	-	2.802.163	2.107.450	2.248.000

Merkezi Araştırma ve Laboratuvar Binası inşaatına 25/12/2012 tarihinde başlanılmış, 18/11/2015 tarihinde iş tamamlanmış olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir. 2015 yılı sonuna kadar 2.247.962,43.-TL harcanmıştır. Merkezi Araştırma ve Laboratuvar Binası inşaatı toplam proje tutarı 13.250.000,00.-TL' dir. 2015 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 11.083.805,61.-TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 83,65 olmaktadır.

### 3.1.1.6 Kamulaştırma

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	2.000	2.000	2.000	213.000	225.000	-
Eklene (Likit)		4.000	239.688			409.490
Bütçe İçi Aktarma						
Düşülen						
Harcama	-	-	88.687	79.913	202.437	389.020

Enstitümüz kamulaştırma giderleri için 2015 Yılı Yatırım Programı ile ödenek verilmemiştir. Enstitümüz likit fazlasından 409.490.-TL ödenek eklenerek, Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan parsel maliklerine 389.020.-TL ödenmiştir.

### 3.1.1.7 2015H032730 Muhtelif İşler

	Yılı Ödeneği	Eklene(Likit)	Bütçe İçi Aktarma	Düşülen	Harcama
Yayın Alımları	1.000.000				999.931
Bilgi Teknolojileri	900.000	193.455		29.000	1.061.832
Makina-Teçhizat	2.500.000				2.156.120
Toplam	4.400.000	193.455		29.000	4.217.883

Enstitümüzün Muhtelif İşler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye yukarıdaki tabloda detaylandırılan tertipler için 4.400.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit fazlası ödenek eklenerek proje tutarı 4.564.455.-TL 'ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2015 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

#### 3.1.1.7.1 Büyük Onarım

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	1.698.000	2.000.000	598.000	2.500.000	627.000	1.175.000	500.000
Eklene (Likit)			173.000		12.000		850.000
Bütçe İçi Aktarma		389.000					
Düşülen	113.000			1.000.000			
Bloke							
Harcama	1.585.000	2.381.000	770.000	1.367.791	633.359	715.000	1.318.243

2015 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 500.000.- TL ödenek verilmiş, 850.000.-TL likit fazlası ödenek eklenmesi yapılmış, harcama 1.318.23.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında yapılan büyük onarım harcamaları	Tutar (TL)
Daire Başkanlıkları binası 304 nolu odanın alçıpan bölme duvar ile bölünmesi ve kapı yapılması	5.605,00
İYTE Rektörlük Binası Zemin kat giriş plaket standı yapılması	22.892,00
İYTE Fen Fakültesi Biyoloji ve B Blok binalarının filter reaktörü takılması ve çeşitli aydınlatma tadilatları yapılması	36.462,00
İYTE Daire Başkanlıkları binası cephe onarımı	570.753,36
İYTE Çeşitli binaları onarım işleri	493.848,16
İYTE şenlik alanı demir korkuluk ve çeşitli onarım işi	18.408,00
İYTE Daire başkanlıkları binası çeşitli onarım işi	51.448,00
İYTE Çeşitli onarım işleri	54.398,00
İYTE Daire başkanlıkları binası Alüminyum doğramalarına jaluzi takılması	18.172,00
İYTE Çeşitli onarım işleri	46.256,00
<b>Toplam Harcama</b>	<b>1.318.242,52</b>

### 3.1.1.7.2 Yayın Alımları

Yıl	Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme
2010	846.000	845.652	%99,9
2011	800.000	799.999	% 100
2012	800.000	799.999	%100
2013	850.265	850.264	%99,9
2014	1.000.000	999.988	%99,9
2015	900.000	999.931	%99,9

2015 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 900.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıda sunulan tabloda belirtilen alımlar için 999.931.- TL tutarında harcama yapılmıştır.

### 2015 Yılı Harcamaları

	Adet	Tutar
Veri Tabanı Ödemeleri	54	873.240,97
Türkçe Kitap Alımı	566	27.294,84
Yabancı Dil Kitap Alımı	141	31.261,58
Elektronik Yabancı Dil Kitap Alımı	72	31.635,00
Türkçe ve Yabancı Dil Basılı Dergi Alımı	54	14.392,66
Multimedya (DVD) Alımı	138	3.495,94
E-Dergi	11	18.610,02
<b>Toplam</b>	<b>1.027</b>	<b>999.931,01</b>

2015 yılı harcamaları ile kütüphane kaynaklarında oluşan artış ve azalışlar ile beş yıllık durum değerlendirme tablosunda belirtilmiş olup bilgiye erişim konusunda yaşanan teknolojik gelişmelerden hareketle elektronik yayınların alımı ağırlık kazanmıştır.

### Kütüphane Kaynakları

Materyal Adı	2011	2012	2013	2014	2015
Toplam Kitap	37.428	40.003	46.381	49.507	50.656
Satın Alınan Kitap	1.675	991	340	553	707
Toplam Elektronik Kitap	114.539	216.753	281.561	313.111	327.557
Abone Olunan Veri Tabanı	82	83	82	76	7
Abone Olunan Güncel Basılı Dergi	158	127	119	113	184
Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu	933	1.053	1.169	1.291	1.374
Abone Olunan Elektronik Dergi	30.522	32.029	32.098	30.027	34.023
Multi Medya Materyal	31.405	30.936	5.116	3.072	3.976

### 3.1.1.7.3 Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2015 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojileri için 400.000 TL yazılım, 500.000 TL donanım harcamaları için toplam 900.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Yazılım Alımları						
Yıl	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ödeneği	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
Eklene		31.000			46.000	144.455
Düşülen	99.000		23.929			29.000
Harcama	177.015	330.713	245.503	270.170	345.225	513.467

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve kampüs işletim sisteminin güncellenmesi amacıyla 400.000.-TL ödenğe 144.455.-TL likit ödenek eklenerek ödenek tutarı 515.455.-TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 513.467- TL'si harcanmıştır.

Bilgisayar Alımları						
Yılı	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ödeneği	300.000	300.000	300.000	400.000	800.000	500.000
Eklene	99.000		223.929	96.600	407.000	49.000
Düşülen						
Harcama	397.352	297.706	523.914	496.600	1.082.005	548.365

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin ve personelinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 500.000.-TL ödenek verilmiş olup ödeneğin yetersiz kalması ile 20.000.-TL likit 29.000.-TL ise yazılım alımlarından aktarılmıştır. Bu ödeneğin 548.365.- TL harcanmıştır.

### 3.1.1.7.4 Makine ve Teçhizat Alımı

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yılı Ödeneği	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.182.000	2.000.000	2.500.000
Eklene (Likit)		500.000	1.200.000			
Bütçe İçi Aktarma						
Düşülen						
Bloke						
Harcama	1.815.756	1.346.278	2.912.000	1.038.243	1.637.895	2.156.120

Enstitümüz makina ve teçhizat alımları için 2015 yılında 2.500.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2.000.000.- TL ödenekten 2.156.119,62 TL'si harcanmıştır.

BİRİMLER DAĞILIMI	HARCAMA
Rektörlük ve Bağlı Birimler	326.438
Mühendislik Fakültesi	1.223.241
Fen Fakültesi	469.736
Mimarlık Fakültesi	136.705
<b>Toplam</b>	<b>2.156.120</b>

### 3.1.2 İzmir Kalkınma Ajansı Desteği İle Yürütülen Projeler

2011 yılı içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı ve İZTEKGEB A.Ş. güdümlü proje desteği ile bir İnovasyon Merkezi kurulması çalışmaları başlamıştır. İnovasyon Merkezi Projesi ile İzmir’de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyon yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturacak, ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, iş fikirlerini kuluçkalarda geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak, üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferini yapacak, ileri teknoloji ürünü teçhizatı içeren teknik atölyeleri sunacak, girişimcileri ve firmaları sürekli güncel ve sosyal bir iş ağında tutarak sinerji yaratmalarını sağlayacak yenilikçi bir arayüz ile işletilen bir merkez kurulacaktır. 7.510 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip olacak olan merkezde, 900 m<sup>2</sup> kuluçka merkezi, 2000 m<sup>2</sup> Ar-Ge ofisleri olacaktır. 24 ay sürecek projede, ayrıca nitelikli sosyal merkezler yer alacaktır. Bölgede inovasyon ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için çeşitli katalizör birimlerine yer verilecektir. Bu birim ve alanlar; Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Teknik Eğitim ve Toplantı Salonları ve Teknik Atölye olarak planlanmıştır.2013 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanılan Merkez inşaatının tamamlanamayan kısmının ikmal ihalesi 2015 yılında yapılmış, kalan kısmın tamamlanması için çalışmalara başlanılmıştır.

## 4.YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

### 4.1. Öneriler

Enstitümüze tahsis edilen yatırım ödeneklerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

5018 sayılı Kanun gereğince, stratejik plan, bütçe ve performans programı bütünleşik değerlendirme sisteminin Kanunda öngörülen şekilde kamu mali yönetiminde etkin kılınması ve hesap verilebilirliğin yine Kanunda öngörülen haliyle etkin kılınması gerekmektedir.



#### 4.2. 2015 Yılı Harcamaları IV. Dönem Gerçekleşme Raporu

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
42104	401	2015H032720	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	İzmir	0	100	0	0	0	168					39	
43225	401	2012H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2015	İzmir	0	40.000	21.869	0	0	12.000					2.882	
42744	401	1995H030670	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	İzmir	0	81.000	78.902	0	0	2.000	(+)	30			1.863	
42117	401	2015H032730	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	İzmir	0	3.900	0	0	0	4.465	(+)	449			4.536	
40447	401	1996H050140	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	İzmir	0	6.000	4.589	0	0	1.000					624	
	401	2015H032740	Yayın Alımları	ÖZEL BÜTÇE	2015	İzmir	0	1.000	0	0	0	1.000					1.000	
<b>Sektör Adı : DKH</b>							<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>105.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.633</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.944</b>
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
43936	401	2012K120750	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2015	İzmir	0	13.420	12.420	0	0	1.000					2.248	
<b>TOPLAM</b>								<b>13.420</b>	<b>12.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>						<b>2.248</b>

#### 4.3. 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		132.000			105.360			20.633						10.944
Sağlık															
DKH	1		13.420			12.420			1.000						2.248
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>															
<b>TOPLAM :</b>	<b>7</b>		<b>145.420</b>			<b>117.780</b>			<b>21.633</b>			<b>0</b>			<b>13.192</b>
