



**T.C**  
**İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ**  
**ENSTİTÜSÜ**

2018 Yılı Yatırım Programı  
İzleme ve Değerlendirme Raporu

# İÇİNDEKİLER

<b>1.YÖNETİCİ ÖZETİ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>4</b>
2.1. MİSYON .....	4
2.2. VİZYON .....	4
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ .....	4
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	4
2.5. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT HİZMET / ÜRETİM KAPASİTESİ .....	5
2.6. 2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE - KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME .....	8
2.7. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	8
<b>3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>9</b>
3.1. DEVAM EDEN PROJELER .....	9
3.1.1 <i>Kamu Yatırım Projeleri</i> .....	9
3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı.....	9
3.1.1.2 2018H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	10
3.1.1.3 2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri .....	10
3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler .....	11
3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	11
3.1.1.6 Kamulaştırma .....	11
3.1.1.7 2018H032920 Muhtelif İşler .....	12
3.1.1.8 2018H032930 Yayın Alımları .....	13
<b>4. 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI.....</b>	<b>14</b>
4.1. 2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI .....	15

# İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

## 2018 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1.YÖNETİCİ ÖZETİ

Enstitümüz, ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacında tanımlanan “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak” misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarını oluşturmuş, stratejilerini belirlemiştir. Enstitümüz kuruluşundan itibaren “araştırma üniversitesi” kimliğinden ödün vermeden eğitim-araştırma faaliyetlerini yürütmüş olup ulusal ve uluslararası düzeyde üst düzey bir başarı grafiği sağlamış bulunmaktadır.

2018 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” temalı projesinin, araştırma odaklı misyon farklılaşması çalışmaları kapsamında “Araştırma Üniversitesi” olmak için niyet beyan eden 58 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Enstitümüz bu statüyü kazanan 10 üniversite arasında yer almıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1.Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

### 2.2 Vizyon

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

### 2.3 Temel Değerlerimiz

“Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır.

Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz;

- Bilimsel araştırma,
- Eğitim-öğretim,
- Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık,
- Kurumsal gelişim,
- Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır.


### 2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları

Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse edilmektedir.

Enstitümüze, 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 proje için toplam 20.010.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen ödenek ekleme işlemleri ile bu tutar 30.580.400 TL' ye ulaşmış ve toplam 25.091.044 TL harcama gerçekleşmiştir.

### Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı

Teknolojik Araştırma	2.510.000.-	%12,54
Eğitim	17.000.000.-	% 84,96
Mamul Mal Alımları .....	6.360.000.-	
Gayri Maddi Hak Alımları .....	400.000.-	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.....	9.750.000.-	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.....	2.925.000.-	
Kamulaştırma .....	75.000.-	
Spor	500.000.-	% 2,50
<b>Toplam</b>	<b>20.010.000.-</b>	<b>% 100</b>

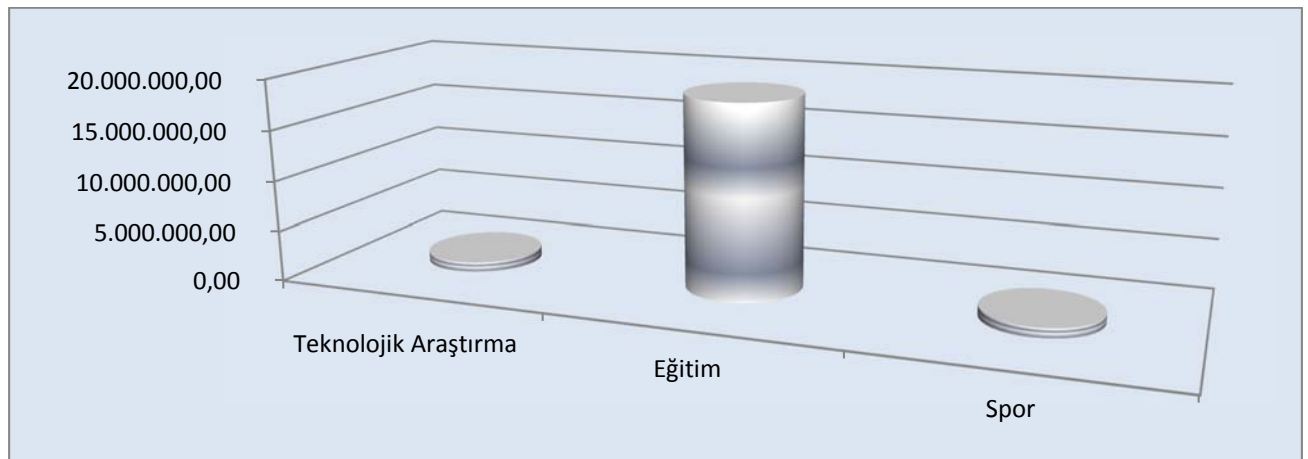

## 2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Enstitümüz kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane'deki iki binada, yaklaşık 5.500 m<sup>2</sup> lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde İzmir'e 45 km, Urla'ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 35.000 dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla / Gülbahçe Köyü'ndeki kampüse taşınmıştır. 2008 yılında Yabancı Diller Bölümü'nün kampüse taşınması ile kampüs yerleşimi tamamlanmıştır.

2018 yılı itibarıyla yerleşkedeki yapılaşma, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 17.118 m<sup>2</sup> alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ait yapılaşma ile toplam 221.047 m<sup>2</sup> lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının 2016 yılında ilk yüklenicisi tarafından yapılmayan geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için ihale yapılmış olup söz konusu iş 2017 yılı içerisinde tamamlanarak, 13.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Merkez 2018 yıl sonu itibarıyla hizmete girmiştir. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projeleri hazırlanmış olup yapım işine 2018 yılında devam edilmiştir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatına Ocak 2017 yılı itibarıyla sözleşme imzalanarak başlanılmış, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Binasının projeleri hazırlanmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (10.980 m<sup>2</sup>) hizmete alınmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, yap-işlet modeli ile yapılan ve 2014 yılında hizmete giren 9.869 m<sup>2</sup> lik Enstitümüz Öğrenci Yaşam Kompleksinde dinlenme, alışveriş vb. sosyal aktivite imkânlarının yanı sıra 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlanmaktadır. 2016 yılında İZKA destekli 7.510 m<sup>2</sup> lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Mayıs/ 2016'da hizmete girmiştir. .

### Yerleşim Durumu

İYTE Yerleşkesi içerisinde bulunan toplam Kapalı Fiziki Yerleşme Alanı 221.047 m<sup>2</sup>'dir.

BİRİMLER	MEVCUT FIZIKI YERLEŞİM (m <sup>2</sup> )
REKTÖRLÜK	2.923
DAİRE BAŞKANLIKLARI	5.154
MERKEZ KAFETERYA	4.684
HAVUZ	3.489
SPOR SALONU	6.469
LOJMANLAR	4.070
AÇIK SPOR TESİSLERİ	4.684
MEDİKO	5.774
KÜTÜPHANE	6.190
ELEK.MUH.LAB 27 5	2.804
YABANCI DİLLER A BLOK	2.571
ELEK.MUH.LAB 27 4	1.825
YABANCI DİLLER DERSLİK B BLOK	1.634
MERKEZİ ATÖLYELER	1.493
ESKİ İNŞ.MÜH LAB	1.571
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ	12.201
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ	16.253
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ	11.550
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ	7.394
GIDA MÜHENDİSLİĞİ	14.500
MİMARLIK A BLOK	4.802
MİMARLIK B BLOK	4.933
MİMARLIK C BLOK	1.015
MİMARLIK D BLOK	848

MİMARLIK E BLOK	2.451
FEN DEKANLIK	3.488
FEN LAB B BLOK	2.939
FEN LAB C BLOK	3.348
FEN ANFİ BİNASI	2.212
FEN FAKÜLTESİ FİZİK	5.612
FEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ	13.849
FEN MATEMATİK	4.603
ÇEVRE AR-GE	1.410
TEKNOPARK	4.200
YÜKSEK TEKNOLOJİ AR-GE	3.000
MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	6.250
YURTLAR	14.127
YAŞAM MERKEZİ	9.869
AR-GE İDARE BİNA	1.645
ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MRK.	484
SAV-TAG AR-GE	1.489
A9 ARGE BİNASI	2.250
A8 KULUÇKA BİNASI	1.480
İNOVASYON BİNASI	7.510
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>221.047</b>

#### Eğitim ve Uygulama Alanları

	Kapasitesi						Genel Toplam
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251-Üzeri	
Amfi			5	1			6
Sınıf	132	30	4	2			168
Bilgisayar Laboratuvarları	19	7	1				27
Diğer Laboratuvarlar	316	9	2				327
Toplantı Salonu	33	3	3				39
Konferans Salonu				1	2		3
<b>Toplam</b>	<b>500</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>570</b>

#### Kantinler ve Kafeteryalar

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)
Kantinler	10	1.670	
Kafeler	2	480	
Merkezi Kafeterya / Personel Yemekhanesi	1	553	1.250
Merkezi Kafeterya/Öğrenci Yemekhanesi	3	1.659	3.750
Öğrenci Yemekhanesi *	1	900	1.100
<b>Toplam</b>	<b>14</b>	<b>5.262</b>	<b>6.100</b>

\*Kredi Yurtlar Kurumu'na aittir.

### Spor Tesisleri

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasite (Kişi)
Kapalı Spor Tesisleri	1	6.469	1.200
Açık Spor Tesisleri	5	4.684	
Kapalı Yüzme Havuzu	1	3.489	265
<b>Toplam</b>	<b>7</b>	<b>14.462</b>	<b>1.465</b>

### Öğrenci Yurtları

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak brüt 15.136 m<sup>2</sup> lik kapalı, yaklaşık 20.000 m<sup>2</sup> (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil ) açık alan, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip yurt alanı bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt alanı "örnek yaşam köyü" yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişiye hizmet verebilen öğrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay-bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır.

	Yatak Sayısı (3 kişilik )
Oda Sayısı	344
Alanı m <sup>2</sup>	15.136 m <sup>2</sup>

### Lojmanlar

	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )	Dolu Lojman Sayısı
Lojmanlar	48	5.220	48

### İYTE Yaşam Merkezi

Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek için 2013 yılında yapılan irtifak hakkı kiralama sözleşmesiyle, içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan 18.554 m<sup>2</sup> lik alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.

### Mevcut Taşıtlar

TAŞITIN CİNSİ	İYTE	Vakıf
Binek Otomobil (Tenezzüh)	4	2
Binek Otomobil (Station)	-	
Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi)	1	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi)	2	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi)	1	
Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişi)	1	
Traktör	1	
İtfaiye Aracı	1	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi)		-
Kamyonet	3	
Kamyon		1
İş Makinası	6	
Arazi Jeep		1
Pic-up (Şöför dâhil 6 kişilik)		1
<b>TOPLAM</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

## 2.6. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

26.09.2018 tarihinde kesin kabulü yapılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (10.950 m<sup>2</sup> ) ile Tümüleşik Araştırma Merkezi binası (6.250 m<sup>2</sup>) 2018 yılında hizmete girmiş olup Enstitü kapalı alan mevcudunu 17.200 m<sup>2</sup> arttırmıştır.

Ayrıca, inşaatı devam Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası fiziken %75 oranında tamamlanmış durumda olup 2019 yılında hizmete alınması planlanan binanın kapalı alan toplamı 14.500 m<sup>2</sup>'dir.

## 2.7. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Yatırım harcamaları için 2018 yılı bütçesi ile 2.510.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektörüne, 17.000.000.-TL Eğitim Sektörüne, 500.000.-TL Spor Sektörüne olmak üzere toplam 20.010.000.-TL ödenek verilmiştir.

1995H030670 Kampüs Altyapısı Projesinden, 2018H032920 Büyük Onarım projesine 2.000.000.TL aktarılmıştır.

Enstitümüz finans fazlasından; 2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 760.000.-TL, 2018H032140 Muhtelif İşler projesi kapsamında yürütülen projelere (Yazılım Alımlarına 69.400.-TL, Bilgisayar Alımlarına 81.000.-TL, Makina-Teçhizat Alımlarına 510.000.-TL, Büyük Onarıma 2.650.000.-TL) toplam 3.310.400.-TL, 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler projesine ise toplam 8.500.000.-TL olmak üzere sermaye giderleri için toplam 12.570.400.-TL finans fazlası ödenek ilavesi gerçekleştirilmiştir.


2018 yılı toplam yatırım ödeneği 20.010.000.- TL iken eklenen Finans Fazlası ile 32.580.400.-TL tutara ulaşmış, bu ödeneğin 25.091.044.-TL'lik tutarı harcanmış. 2018 yılı bütçesi yatırım gerçekleştirmeleri incelendiğinde, yatırım harcamalarının bütçemizde % 18,90 paya sahip olduğu ancak, toplam 25.091.044.- TL yatırım harcamasının % 48,57'lik dilimini 12.186.263.- TL' sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.

Projenin Adı	KBÖ Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
2018H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500			500	395	79
2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	7.000	7.000		14.000	10.050	71,79
1995H030670 Kampüs Altyapısı	2.250	1.500	2.000	1.750	1.740	99,45
2018H032920 Muhtelif İşler	5.425	3.310		8.735	8.182	93,67
2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500	760		1.260	391	31,03
2018H032930 Yayın Alımları	1.750			1.750	1.750	100
Kamulaştırma	75			75	71	95
2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10			10	10	100
2016K121270 Kütle Spektrometre Merkezi	2.500			2.500	2.500	100



## Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı

Birim Adı	06.1 Mamul Mal Alımları	06.3 G.Maddi Hak Alımları	06.4 G.Menkul Alımları ve Kamulaştırma	06.5 G.Menkul Üretim Giderleri	06.7 G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	Harcama Toplamı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.006.619					2.006.619
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.750.000					1.750.000
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			70.717	12.186.263	5.055.283	17.312.263
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	651.950	468.812				1.120.762
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	79.650				311.750	391.400
Teknolojik Araştırma	2.510.000					2.510.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.988.219</b>	<b>468.812</b>	<b>70.717</b>	<b>12.186.263</b>	<b>5.367.033</b>	<b>25.091.044</b>

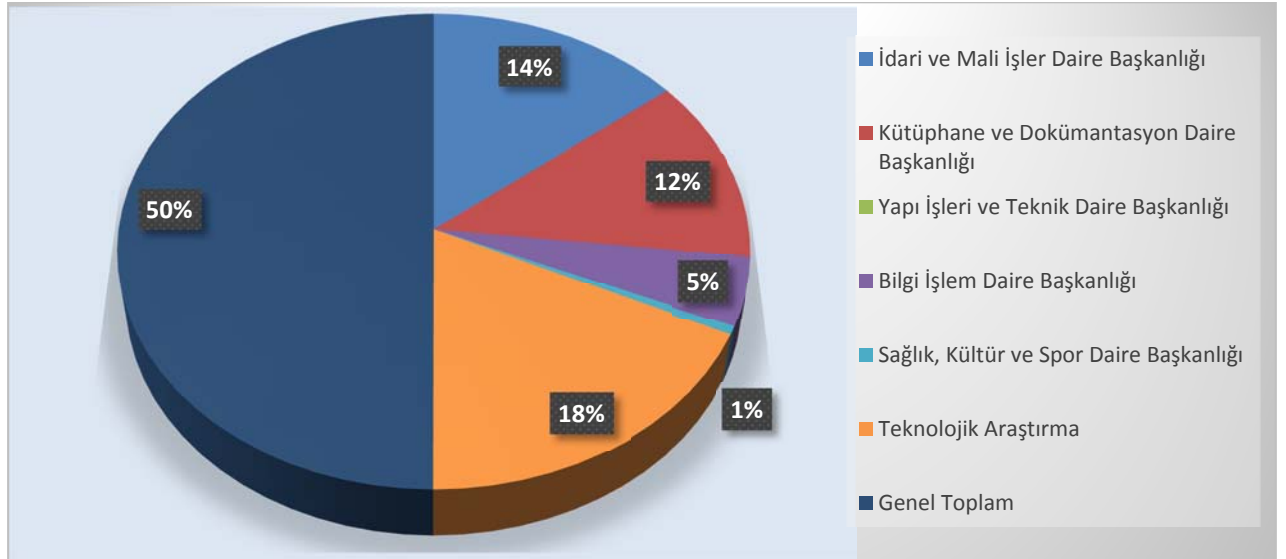

## 3. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 3.1. Devam Eden Projeler

#### 3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

##### 3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.550.000	2.250.000
Eklene (Likit)		30.000	201.000		1.500.000
Bütçe İçi Aktarma			350.000	1.850.000	
Düşülen					2.000.000
Bloke					
<b>Harcama</b>	<b>2.980.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>512.646</b>	<b>1.738.025</b>	<b>1.740.459</b>

### **2018 Yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;**

#### **Kampüs içerisindeki yol ve çevre aydınlatma armatürlerinin led armatürlerle değiştirilmesi işi:**

İşin ihalesi 22.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 17.04.2018 tarihinde 284.240,00 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında arızalı olan 254 adet 250W, 51 adet 150W sodyum buharlı armatür, 60W, 78W ve 155W led armatürle değiştirilmiştir. Söz konusu armatürler mevcut kablosuz kontrol sistemine entegre edilmiştir.

#### **İYTE 250KW rüzgar enerjisi tesisi yapım işi:**

İşin ihalesi 19.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 03.05.2018 tarihinde 2.770.000,00TL +KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. İşin sözleşmeye göre bitim tarihi 29.12.2018'dir. Türbinin temeli tamamlanmış olup, ankraj sepetinin montajı yapılmıştır. Enerji nakil hattı bitmiş, kanatların iş mahalline sevki yapılmıştır. Türbinin imalatı devam etmektedir.

### **3.1.1.2 2018H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	100.000	100.0000	100.000	500.000	500.000
Eklene ( Likit )		68.000		460.200	
Bütçe İçi Aktarma			350.000		
Düşülen					
Harcama	<b>20.000</b>	<b>39.000</b>	<b>69.000</b>	<b>809.574</b>	<b>395.575</b>

#### **333 ada 376 ve 429 numaralı parsellerin yola terk tevhid ifraz işlemlerinin yapılması işi:**

Doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilerek, 09/03/2018 tarihinde 25.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.

#### **İYTE Kampüsü muhtelif ada ve parsellerde sayısal halihazır harita hazırlanması işi:**

ihalesi 25.07.2017 tarihinde yapılarak 170.000,00TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. İş tamamlanmış olup, Mart 2018 tarihinde kabulü yapılmıştır.

#### **Daire Başkanlıkları binası cephe kaplamaları işi:**

İnşaat Mühendisleri Odasından bilir kişi talep edilmiş ve 3.000,00-TL ödeme yapılmıştır.

#### **333 ve 376 nolu parselde zemin etüdü yapılması işi:**

Doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilerek 7.000,00.-TL KDV dahil tutarında sözleşme imzalanmıştır. İş tamamlanarak Kasım 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.

#### **7360kVA'lık ilave trafo gücünün projelendirilmesi işi:**

12.900,00TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmış olup, iş tamamlanarak kabul işlemleri yapılmıştır.

### **3.1.1.3 2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	2.400.000	1.000.000	2.000	1.000.000	500.000
Eklene (Likit)	1.440.000			124.000	760.000
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Harcama	<b>3.799.000</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	<b>192.601</b>	<b>868.600</b>

### 3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	9.500.000	12.000.000	9.500.000	10.938.000	7.000.000
Eklene (Likit)	1.750.000			1.300.000	7.000.000
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Bloke					
Harcama	8.701.000	2.882.000	6.831.428	11.183.679	10.050.830

### Mühendislik Fakültesi Elektrik –Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı

2015 yılında yapım ihalesine çıkılan ve 11.540.000,00.-TL (KDV hariç) teklif bedeli ile sözleşme imzalanarak inşaata başlanmıştır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası, 08.09.2017 tarihinde binanın geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. 2018 yılı içerisinde binanın mobilyaları tamamlanmış ve bina hizmete girmiştir. 2018 yılında kesin kabulü gelen binanın 26.09.2018 yılında kesin kabulü yapılarak, hizmete girmiştir.

### Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Fakültesi Bölüm Binası İnşaatı

2016 yılı Aralık ayında yapım ihalesine çıkılarak 17.460.000,00.-TL (KDV hariç) teklif bedeli ile sözleşmesi imzalanmış ve temel kazısına başlanmıştır. 2018 yılı itibarı ile binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Dış cephe imalatları (mermer, doğrama, terracotta) devam etmektedir. Elektrik tesisatı için boru-kasa altyapısı yapılmış, galvaniz kablo kanalları döşenmiştir. Elektrik panolarının kasa altyapısı yapılmış olup, panolar iç tesisatı ile birlikte montaja hazır durumdadır. Bina sıhhi tesisatında atık su ve kullanma suyuna ait boru hatları, sıhhi tesisat olan mahallere kadar çekilmiştir. Fancoil tesisatına ait borular tüm mahallerde çekilmiş olup, fancoil ünitelerinin mahallerde montaj işlemleri devam etmektedir. Binanın soğutmasında kullanılacak olan Chiller üniteleri teras çatıda yerlerine konulmuş olup, boru bağlantıları yapılmıştır. Havalandırma tesisatının bulunduğu mahallere havalandırma kanalları çekilmiş, klima santralleri ve aspiratörler teras çatıda yerlerine konularak havalandırma kanal bağlantıları tamamlanmıştır. Yangın tesisatına ait borular tüm mahallerde çekilmiş, yangın dolaplarının montajları yapılmıştır. Binanın fiziken %75'i tamamlanmış durumda olup 2019 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.

### 3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	3.150.000	1.000.000	1.510.000	1.010.000	10.000
Eklene (Likit)					
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Bloke					
Harcama	2.107.450	2.248.000	994.803	2.802.353	10.000

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının 2016 yılında ilk yüklenicisi tarafından yapılmayan geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için ihale yapılmış olup söz konusu iş 2017 yılı içerisinde tamamlanarak 13.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2018 yılında; İş kapsamında binanın projelere göre eksikleri giderilmiş, yerinde yapılıp zarar görmüş ve/veya yapılmamış imalatlar tamamlanmış ve hizmete girmiştir.

### 3.1.1.6 Kamulaştırma

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	225.000	-		2.000	75.000
Eklene (Likit)		409.490	512.773	89.365	
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Harcama	202.437	389.020	509.458	91.130	70.717

2018 yılı içerisinde; 769 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İYTE adına kamulaştırılması için 8.178,32 TL ve Urla ilçesi, Gülbahçe mahallesi mevki 899 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması için 13.735,52 TL ödeme yapılmıştır.

### 3.1.1.7 2018H032920 Muhtelif İşler

	Yılı Ödeneği	Eklene(Likit)	Bütçe İçi Aktarma	Düşülen	Harcama
Büyük Onarım	2.925.000	2.650.000			5.055.283
Bilgi Teknolojileri	1.000.000	150.400			1.120.762
Makina-Teçhizat	1.500.000	510.000			2.006.619
<b>Toplam</b>	<b>5.425.000</b>	<b>3.310.400</b>			<b>8.182.664</b>

Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye, tabloda detaylandırılan tertipler için 5.425.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde finans fazlası ve kurum içi aktarma ile ödenek eklenerek proje tutarı 3.310.400 TL'ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2018 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir

#### 3.1.1.7.1 Büyük Onarım

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	1.175.000	500.000	500.000	1.000.000	2.925.000
Eklene (Likit)		850.000		750.000	2.650.000
Bütçe İçi Aktarma				750.000	
Düşülen					
Bloke					
Harcama	715.000	1.318.243	321.031	2.395.998	5.055.283

2018 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 2.925.000.- TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde Enstitümüz finans fazlasından 650.000.-TL ödenek ekleme ve Kampüs Altyapısı Projesinden 2.000.000.-TL ödenek aktarılması yapılarak toplam ödenek 5.575.000.-TL olmuştur. Harcama 5.055.283.-TL olarak gerçekleşmiştir.

#### 3.1.1.7.2 Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2018 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojilerine 400.000 TL yazılım, 600.000 TL donanım harcamaları için toplam 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

##### Yazılım Alımları

Yıl	2013	2014	2015	2016	2017
Ödeneği	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Eklene	46.000	144.455	90.000	11.500	69.400
Düşülen		29.000			
Harcama	345.225	513.467	480.078	411.376	468.812

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, kampüs işletim sisteminin güncellenmesi için 400.000.-TL ödeneye 69.400.-TL likit fazlası ödenek eklenerek, toplam ödenek tutarı 469.400.-TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 468.812TL'si harcanmıştır.

##### Bilgisayar Alımları

Yılı	2014	2015	2016	2017	2018
Ödeneği	800.000	500.000	1.000.000	600.000	600.000
Eklene	407.000	49.000	250.000	42.000	81.000
Düşülen					
Harcama	1.082.005	548.365	1.220.662	641.353	651.950

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 600.000.-TL ödenek verilmiş, ödeneğin yetersizliği nedeniyle 81.000.-TL likit fazlası ödenek eklenmiş, bu ödeneğin 651.950 TL'si harcanmıştır.

### 3.1.1.7.3 Makina ve Teçhizat Alımı

	2014	2015	2016	2017	2018
Yılı Ödeneği	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.827.500	1.500.000
Eklene (Likit)					510.000
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Harcama	1.637.895	2.156.120	2.434.159	1.056.497	2.006.619

Enstitümüz makina - teçhizat alımları için 2018 yılında 1.500.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 510.000.TL finans fazlası eklemesi yapılmış ve yıl içinde toplam ödenekten 2.006.619.-TL harcama yapılmıştır.

### 3.1.1.8 2018H032930 Yayın Alımları

#### Yayın Alımları

Yıl	Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme
2011	800.000	799.999	% 100
2012	800.000	799.999	%100
2013	850.265	850.264	%99,9
2014	1.000.000	999.988	%99,9
2015	900.000	999.931	%99,9
2016	1.000.000	1.099.999	%99,9
2017	1.000.000	999.907	%99,9
2018	1.750.000	1.750.000	%100

2018 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 1.750.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup tabloda belirtilen alımlar için mevcut ödenegin tamamı harcanmıştır.

#### 2018 Yılı Harcamaları

	Adet	Tutar
Veri Tabanı Ödemeleri	45	1.439.182,98
Türkçe Kitap Alımı	553	16.065,53
Yabancı Dil Kitap Alımı	128	57.044,07
Elektronik Yabancı Dil Kitap Alımı	3381	201.049,56
Türkçe ve Yabancı Dil Basılı Dergi Alımı	37	23.630,67
Multimedya (DVD) Alımı	20	6.113,37
E-Dergi	5	6.913,66
<b>Toplam</b>	<b>4169</b>	<b>1.749.999,84</b>

#### Kütüphane Kaynakları

Materyal Adı	2014	2015	2016	2017	2018
Toplam Kitap	49.507	50.656	51.932	52.928	54.568
Satın Alınan Kitap	553	707	547	337	681
Toplam Elektronik Kitap	313.111	327.557	402.781	411.748	428.660
Abone Olunan Veri Tabanı	76	76	76	78	89
Abone Olunan Güncel Basılı Dergi	113	184	114	88	60
Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu	1.291	1.374	1.419	1.654	1.793
Abone Olunan Elektronik Dergi	30.027	34.023	36.129	34.492	40.440
Multi Medya Materyal	5.116	3.072	3.976	3.453	2.065

#### 4. 2018 Yılı Yatırım Programı

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  
PROJE SAHİBİ: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.

(Bin TL.)

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2017 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2018 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ					-	143.319	-	110.731	-	16.925
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	500	-	-	-	500
a) 2018 yılında bitenler					-	500	-	-	-	500
2018H032910	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	Etüd-Proje	2018-2018	-	500	-	-	-	500
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	135.644	-	110.731	-	9.250
b) 2018 yılından sonraya kalanlar					-	135.644	-	110.731	-	9.250
1995H030670	Kampüs Altyapısı	İzmir	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	1995-2020	-	97.870	-	90.620	-	2.250
2012H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Eğitim (20500 m <sup>2</sup> )	2012-2019	-	37.774	-	20.111	-	7.000
	Fen Fakültesi Laboratuvar Binası	İzmir	Eğitim (6000 m <sup>2</sup> )	2012-2018	-	15.111	-	14.111	-	1.000
	Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası	İzmir	Eğitim (14500 m <sup>2</sup> )	2016-2019	-	22.663	-	6.000	-	6.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	7.175	-	-	-	7.175
a) 2018 yılında bitenler					-	7.175	-	-	-	7.175
2018H032920	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onanm, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2018-2018	-	5.425	-	-	-	5.425
2018H032930	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2018-2018	-	1.750	-	-	-	1.750
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ					-	500	-	-	-	500
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	500	-	-	-	500
a) 2018 yılında bitenler					-	500	-	-	-	500
2018H050620	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Bakım Onanm, Makine-Teçhizat	2018-2018	-	500	-	-	-	500

SEKTÖRÜ: DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA  
PROJE SAHİBİ: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.

(Bin TL)

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BITİŞ YILI	PROJE TUTARI		2017 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2018 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ					-	30.852	-	19.360	-	2.510
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	30.852	-	19.360	-	2.510
a) 2018 yılında bitenler					-	18.282	-	18.272	-	10
2012K120750	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	İnşaat (6250 m <sup>2</sup> ), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2012-2018	-	18.282	-	18.272	-	10
	İnşaat	İzmir	İnşaat (6250 m <sup>2</sup> )	2012-2013	-	9.391	-	9.391	-	-
	Diğer	İzmir	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2012-2018	-	8.891	-	8.881	-	10
b) 2018 yılından sonraya kalanlar					-	12.570	-	1.088	-	2.500
2016K121270	Kütle Spektrometre Merkezi	İzmir	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2016-2020	-	12.570	-	1.088	-	2.500

#### 4.1. 2018 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı

(Bin TL)

SEKTÖRLER	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		ETÜD PROJE		DEVAM EDEN PROJELER		YENİ PROJELER		2018 YATIRIMI	
		DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
EĞİTİM	6	-	143.819	-	110.731	-	500	-	9.250	-	7.675	-	17.425
DİĞER KAMU HİZMETLERİ	2	-	30.852	-	19.360	-	-	-	2.510	-	-	-	2.510
DKH-SOSYAL	2	-	30.852	-	19.360	-	-	-	2.510	-	-	-	2.510
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>174.671</b>	<b>-</b>	<b>130.091</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>11.760</b>	<b>-</b>	<b>7.675</b>	<b>-</b>	<b>19.935</b>
