



T.C
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ

2024 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme Raporu

İZMİR
Mart, 2025

İÇİNDEKİLER

1.YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
2. GENEL DEĞERLENDİRME	2
2.1.MİSYON	2
2.2 VİZYON.....	2
2.3 TEMEL DEĞERLERİMİZ	2
2.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2
2.5. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT HİZMET / ÜRETİM KAPASİTESİ	3
2.6. 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE - KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME	7
2.7. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	7
3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	9
3.1. DEVAM EDEN PROJELER	9
3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	9
3.1.1.1 2023H03-212407 Kampüs Altyapısı	9
3.1.1.2 2024H03-232928 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	10
3.1.1.3 2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler.....	10
3.1.1.3.1 Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı;	10
3.1.1.3.2 Yurt Binası –Lisansüstü Köyü İnşaatı.....	11
3.1.1.4 2024H03-233015 Muhtelif İşler.....	12
3.1.1.4.1 Büyük Onarım.....	12
3.1.1.4.2 Bilgi Teknolojileri	20
3.1.1.4.3 Makina ve Teçhizat Alımı.....	21
3.1.1.4.4 Menkul Malların Büyük Onarımı	21
3.1.1.5 2024H03-232919 Yayın Alımları.....	21
3.1.1.6 2024H03-233000 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	22
3.1.1.7 2024H03-233458 Büyük Onarım- Fen A-B-C Blok Güçlendirme	22
3.1.1.8 20223H05-214620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	23
4. 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI.....	24
4.1. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	27

1.YÖNETİCİ ÖZETİ

Enstitümüz, ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacında tanımlanan “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak” misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarını oluşturmuş, stratejilerini belirlemiştir. Enstitümüz kuruluşundan itibaren “araştırma üniversitesi” kimliğinden ödün vermeden eğitim-araştırma faaliyetlerini yürütmüş olup ulusal ve uluslararası düzeyde üst düzey bir başarı grafiği sağlamış bulunmaktadır.

Enstitümüz, üniversiteleri sürdürülebilirlik, eğitim ve araştırma gibi alanlarda değerlendiren Uluslararası GreenMetric 2024 sıralamasında dünyanın en iyi 140. üniversitesi olma başarısı gösterdi. Yükseköğretimin Oscarı olarak kabul edilen THE Awards Asia 2024’te “Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü”nün sahibi oldu. THE Awards Asia 2024’de “Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü” uluslararası arenada her geçen gün marka değerini güçlendiren İYTE’ye layık görüldü.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Prof.Dr. Yusuf BARAN
REKTÖR

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

2.2 Vizyon

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

2.3 Temel Değerlerimiz

- Mükemmellik: İYTE'liler eğitim ve araştırmada, bireyler arası, toplumsal, kurumsal ve doğa ile ilişkilerinde, bilinçli bir farkındalık, dürüstlük, doğruluk, cesaret gibi erdemlere dayanan bir mükemmelliği esas alır.
- Adalet: İYTE'liler kurumsal ilişkilerinde, eğitim ve araştırmada kaynakların adil dağıtımını ve fırsat eşitliğini; tüm değerlendirme süreçlerinde nesnel ölçütleri ve liyakatı; bilimsel ve teknolojik çözümler üretirken toplumsal adaleti ve refahı gözetir.
- Özgürlük: İYTE'liler için bilimsel özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştirel düşünce vazgeçilmezdir.
- Yaratıcılık: İYTE'liler araştırma ve eğitimde hayal gücü, yaratıcılık ve umudu destekler; paylaşımcı ve üretken işbirliği ile bilim ve teknolojide özgün, yenilikçi ve öncü olmayı hedefler.
- Sorumluluk: İYTE'liler bütün eylemlerini toplumsal, çevresel ve kurumsal sorumluluk bilinciyle şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde yürütür ve sonuçlarını üstlenir.
- Saygı: İYTE'liler kurum içi ve dışındaki tüm ilişkilerinde dil, din, ırk, kültür, cinsiyet ve tür ayrımı gözetmeden tüm farklılık ve haklara saygılı, duyarlı ve kapsayıcıdır.


2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları

Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

Enstitümüze, 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan 10 proje için toplam 335.002.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde 65.217.000.-TL Finans Fazlası, 15.000.000.-TL yedek ödenek aktarımı, 25.100.000.TL kurumlar arası aktarma ile toplamda 105.317.000.-TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Tasarruf tedbirleri gereği Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Re'sen 24.000.200.-TL ödenek yedeğe aktarılmış, 3.570.000-TL ödenek ise cari harcamalarımızda kullanılmak üzere cari tertiplerimize aktarılmış toplamda 27.572.000.-TL sermayeye ödeneği kesintiye uğramış toplam ödenek tutarı 412.748.800.-TL olarak gerçekleşmiş ve bu tutarın 250.133.689,64.-TL'si harcanmıştır.

Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı

Teknolojik Araştırma	95.002.000.-	%28,36
Eğitim -Yükseköğretim	220.000.000.-	%65,67
Mamul Mal Alımları	37.026.000.-	
Gayri Maddi Hak Alımları	8.200.000.-	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.....	125.000.000.-	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderler.....	48.000.000.-	
Menkul Malların Büyük Onarım Giderler.....	1.774.000.-	
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	20.000.000.-	%5,97
Toplam	335.002.000.-	%100

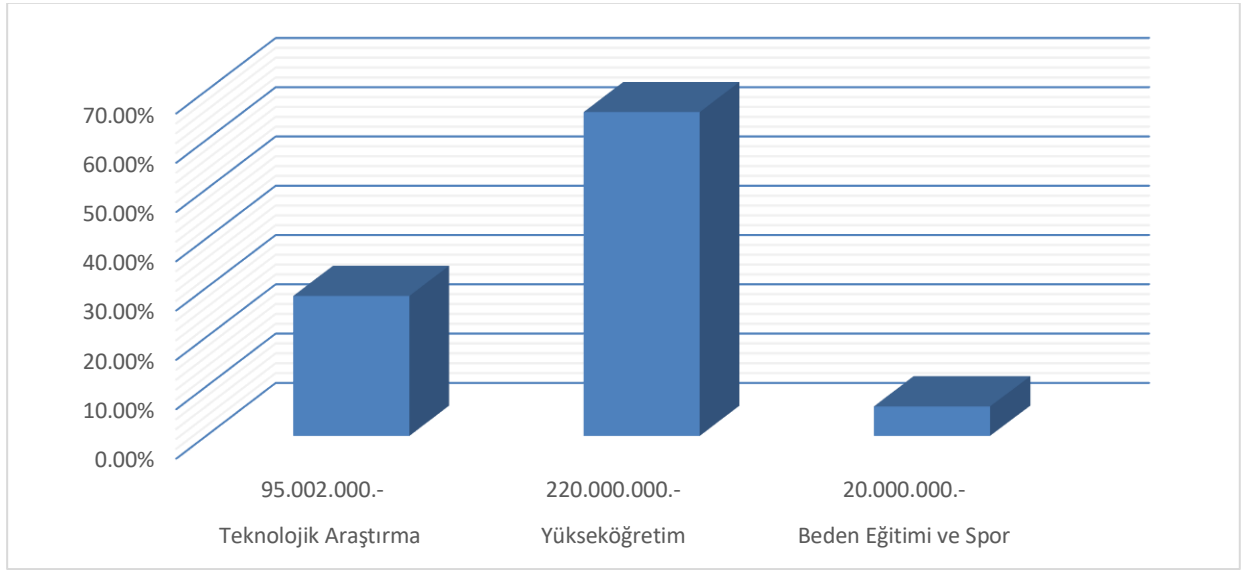

2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Kampüs, Çeşme- Karaburun Yarımadası'nın kesiştiği noktada kurulmuştur. Yarımada eski çağlardan beri termal banyolarıyla tanınmıştır. Kampüsümüzde antik hamam, şelale, zeytinlikler, üzüm bağları ve jeotermal kaynaklar mevcuttur. Deniz kıyısında, kentsel yerleşim yerlerinden uzakta, doğal ve tarihi zenginliğe sahip bir alanda kurulan İYTE Gülbahçe Kampüsü, geniş araştırma ve yaşam alanları ve bölgesel imkânlarıyla öğrenci, araştırmacı ve bilim insanlarına her türlü olanağı sağlamaktadır.

Enstitü kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane'deki iki binada, yaklaşık 5.500 m²'lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim 1999 tarihinde İzmir'e 45 km, Urla'ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 350 hektarlık bir alanda kurulmuş olan Urla-Gülbahçe'deki kampüsüne taşınmıştır. Alsancak'taki binada 2008 yılına kadar eğitim veren Yabancı Diller Bölümü'nün taşınması ile Gülbahçe Kampüsü yerleşimi tamamlanmıştır. Kampüsteki kapalı alan 2023 yılı son itibarıyla Teknopark İzmir ve Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yapılarla birlikte 250.960 m²'lik alana ulaşmıştır. 2023 yılı Şubat ayında hizmete alınan 13.730 m² 'lik 1000 kişilik kapasiteye sahip Urla erkek öğrenci yurdu AFAD koordinatörlüğünde yapılmıştır. 2023 yılı Ekim ayında 29.915m² ve 1374 öğrenci kapasitesine sahip Urla kız öğrenci yurdu Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılarak hizmete alınmıştır. 1233 m²'lik Teknopark B1 ve 7354 m²'lik B2 binaları 2023 yılında hizmete alınmıştır.

5 bloktan oluşan İYTE Öğrenci Köyü'nde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin konaklamasına imkanı sağlamaktadır. Sırası ile 2014 yılında 16.253 m² 'lik İnşaat Mühendisliği Bölüm Binasının, 2015 yılında 3.762 m² 'lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzunun, 2017 yılında tamamlanan 6.250 m² 'lik Merkezi Araştırma Laboratuvarının ve 2018 yılında hizmete alınan 10.950 m² 'lik Elektrik Elektronik Bölüm binasının hizmete girmesi ile fiziki kapasitede ciddi artış sağlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının hizmete girmesi ile Malzeme Araştırma Merkezi, Çevre Geliştirme ve Uygulama Araştırma Merkezi, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve yeni açılan Tematik İleri Araştırma Merkezleri bir çatı altında toplanmıştır.

Kampüs alanımız içinde 2022 yılında yapımına başlanan toplam 65.000 m² ' lik proje alanına sahip Bilişim Vadisi Urla 2023 yılında hizmete alınmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaatlar haricinde, Kat İrtifakı ile 2012 yılında ihalesi yapılan 7.781 m²'lik İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir. Dinlenme, alışveriş ve benzeri sosyal aktivite imkânlarının yanı sıra 625 öğrenciye konaklama imkânı da sağlanmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) destekli 7510 m²'lik Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi 2016 Mayıs ayında hizmete girmiştir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası 2020 Yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır. İnşaatı devam eden Fen Fakültesi Laboratuvar Binasının tamamlanma oranı %81'lerdedir.

Yerleşim Durumu

Kampüs Birimlerinin Mekânsal Dağılımı ve Başlangıç Tarihleri;

BİRİM ADI	ALAN (m ²)	İNŞAATA BAŞLANGIÇ TARİHİ	HİZMETE GİRİŞ TARİHİ
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER			
Rektörlük Binası	2.998	1994	1999
Daire Başkanlıkları Binası	4.681	1994	2000
Merkez Kafeterya	4.583	1998	2002
Merkezi Kütüphane	5.498	2002	2008
Kapalı Spor Salonu	6.311	1998	2008
Lojmanlar	4.070	2001	2002
Açık Spor Tesisleri	4.684		
İYTE Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	3.352	2013	2015
Merkezi Atölyeler Binası	1.483	1994	2001
Eski İnşaat Mühendisliği Lab. Binası	1.886	1994	2001
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ			
Kimya Mühendisliği Bölümü	10.810	2000	2005
Makina Mühendisliği Bölümü	10.795	2005	2009
İnşaat Mühendisliği Bölümü	14.103	2012	2014
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	7.439	2015	2017
GIDA MÜHENDİSLİĞİ	14.500	2016	2018
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(Mediko)	5.332	1998	2008
YABANCI DİLLER Y.O.			
Yabancı Diller Derslik A Blok	1.547	1994	2000
Yabancı Diller Derslik B Blok	1.949	1994	1998
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar Binası	2.462	1994	1998
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yabancı Diller İdari Blok	2.712	1994	1998
MİMARLIK FAKÜLTESİ			
Dekanlık Binası	2.481	2004	2007
Stüdyo Binası A Blok	4.334	1994	1999
Stüdyo Binası B Blok	4.562	1994	1999
Akademik Personel Binası	924	1994	2002
Atölyeler	883	1994	2004
FEN FAKÜLTESİ			
Derslikler ve Konferans Salonu	2.108	2002	2004
Fizik Bölümü	5.061	2004	2007
Matematik Bölümü	3.705	2008	2011
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü	10.998	2008	2011
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ			
İzmir Çevresi Çevre Referans Ar-Ge Laboratuvarları	1.432	1998	2002
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.396	2012	2017
YURTLAR			
Öğrenci Yurtları (KYK ait)	14.127	2002	2005

ÖĞRENCİ YURDU-AFAD (KYK ait)	13.730	2022	2023
ÖĞRENCİ YURDU (KYK ait)	29.915	2021	2023
İYTE Yaşam Merkezi	7.781	2013	2014
TEKNOPARK A.Ş.			
A1	2.603	2003	
A10	7.510	2016	
A2	900	2005	
A3	2.650	2004	
A4	1.582	2008	
A5		2018	
A6		2018	
A7	2.000	2012	
A8	1.480	2013	
A9	2.190	2013	
A12	486	2016	
B1	1.233	2021	
B2	7.354	2022	
İYTE SERA-YENİ	504	2022	
ESKİ JANDARMA BİNASI	156	2022	
REKTÖRLÜK KONTROLLÜK	89	1996	
MÜHENDİSLİK KONTROLLÜK	89	1996	
KİDONYA	228		
KİDONYA YANI ESKİ KONTROLLÜK BİNASI	100		
ASMALI BAHÇE	252		
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KÖYÜ	247	2023	
MEDİKO ŞANTİYE	100		
SPOR ŞANTİYE	75		
FEN SERA	400		
MEDİKO AMBULANS GARAJI	100		
T O P L A M	250.960		

Eğitim ve Uygulama Alanları

	Kapasitesi						
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251-Üzeri	Genel Toplam
Amfi			5	1			6
Sınıf	132	30	4	2			168
Bilgisayar Laboratuvarları	19	7	1				27
Diğer Laboratuvarlar	316	9	2				327
Toplantı Salonu	33	3	3				39
Konferans Salonu				1	2		3
Toplam	500	49	15	4	2		570

Kantinler ve Kafeteryalar

	Adet	Alan (m ²)	Kapasite (Kişi)
Kantinler	10	1.670	
Kafeler	2	480	
Merkezi Kafeterya / Personel Yemekhanesi	1	553	1.250
Merkezi Kafeterya/Öğrenci Yemekhanesi	3	1.659	3.750
Öğrenci Yemekhanesi *	1	900	1.100
Toplam	17	5.262	6.100

*Kredi Yurtlar Kurumu'na aittir.

Spor Tesisleri

	Adet	Alan (m ²)	Kapasite (Kişi)
Kapalı Spor Tesis	1	6.311	1.200
Açık Spor Tesisleri	10	4.684	
Kapalı Yüzme Havuzu	1	3.351	265
Toplam	12	14.346	1.465

Öğrenci Yurtları

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Urla Yurt Müdürlüğü (Erkek/Kız) olarak brüt 14.127 m² lik kapalı alan, yaklaşık 20.000 m² (bahçe, yürüme ve araç yolları dahil) açık alan, 48 adet bina 1032 kişilik kapasiteye sahip yurt alanı bulunmaktadır.

Urla Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü; brüt 13.730 m² lik alan üzerinde 6 blok (5 blok öğrenci binası, 1 blok idari bina ve sosyal tesis binası) bulunmaktadır. Müdürlüklerimizde Lokanta-Kantin İşletmesi ve Urla Yurt Müdürlüğünde 1 adet Basketbol Sahası bulunmaktadır. Urla Yurt Müdürlüğü' nde Erkek öğrenci çamaşırlarının yıkandığı 24 adet çamaşır makinesi, 24 adet kurutma makinesi bulunmaktadır.

Urla Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü; brüt 29.915 m² lik alan üzerinde, 1374 kişilik kapasiteye sahip yurt alanı bulunmaktadır. Urla Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde tüm öğrenci bloklarında 10 çamaşır makinesi, 5 kurutma makinesi bulunmaktadır.

YURT ADI	ALANI M2
Urla Yurt Müdürlüğü (Erkek /Kız)	14.127 m ²
Urla Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü	13.730 m ²
Urla Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü	29.915 m ²

*Kredi Yurtlar Kurumu'na aittir.

Lojmanlar

	Adet	Alan (m ²)	Dolu Lojman Sayısı
Lojmanlar	48	5.220	48

İYTE Yaşam Merkezi

Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek için 2013 yılında yapılan irtifak hakkı kiralama sözleşmesiyle, içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciyi konaklama imkânı sağlayan 7.781 m² lik alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.

Mevcut Taşıtlar

TAŞITIN CİNSİ	İYTE	Vakıf
Binek Otomobil (Tenezzüh)	4	1
Binek Otomobil (Station)	-	-
Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi)	2	-
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişi)	3	-
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi)		
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişi)	1	
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişi)	2	
Traktör	2	
İtfaiye Aracı	1	
Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi)		
Kamyonet		
Kamyon (Tam yük ağırlığı en az 17.000 kg)		
Vidanjör		1
Panel	1	
Pic-up (Şöför dâhil 6 kişilik)	3	1
TOPLAM	19	3

2.6. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası işine 2024 yılında devam edilmiştir. Güçlendirme çalışmaları 2024 yılında başlanmıştır.


2.7. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

Yatırım harcamaları için 2024 yılı bütçesi ile 95.002.000-TL Teknolojik Araştırma Sektörüne, 220.000.000-TL Eğitim Sektörüne, 20.000.000-TL Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne olmak üzere toplam 335.002.000.-TL ödenek verilmiştir. Enstitümüz finans fazlasından; 2024H03-233015 Muhtelif İşler –Gayrimenkul Büyük Onarım 12.974.000.-TL, 2024H03-233015 Muhtelif İşler –Makine Teçhizat alımları projesine 9.447.000 TL, , 2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler –Yurt Binasına 15.000.000.-TL, 2024H03-232919 Yayın Alımı 1.037.000.-TL, 2024H03-232928 Çeşitli Ünitelerin Etüt projesine 1.735.000.-TL, 2024H03-233458 Büyük Onarım projesine 25.000.000-TL, 2024H03-233000 UBYs projesine 24.000-TL olmak üzere toplam 65.217.000.- TL finans fazlası ödenek ilavesi gerçekleştirilmiştir. 2024 yıl içerisinde 2024H03-233015 Muhtelif İşler –Gayrimenkul Büyük Onarım projesine 15.000.000.-TL yedek ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde 2024K12-236077 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri açılarak Kurumlar Arası Aktarma ile 25.100.000.-TL ödenek aktarılmıştır. 2024 yılı toplam yatırım ödeneği 335.002.000.-TL iken eklenen Finans Fazlası, yedek ödenek ve kurumlar arası aktarma 412.748.800-TL tutara ulaşmış, bu ödeneğin 250.133.689,64-TL'lik tutarı harcanmıştır. 2024 yılı bütçesi yatırım gerçekleştirmeleri incelendiğinde, yatırım harcamalarının toplam bütçe harcamalarında % 18,09 paya sahip olduğu, toplam 250.133.689,64-TL'lik yatırım harcamasının %65,56 dilimi olan 163.999.152,67- TL' sini Mamul Mal Alımları giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.

Projenin Adı	KBÖ Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
2023H03-212407 Kampüs Altyapısı	20.000.000		2.000.000	18.000.000	11.215.461,60	62,31
2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler	90.000.000	15.000.000	12.570.000	92.430.000	35.999.929,12	38,95
2024H03-233015 Muhtelif İşler	45.000.000	39.421.000	4.620.000	79.801.000	68.790.974,02	86,20
2024H03-232919 Yayın Alımı	9.500.000	1.037.000	950.000	9.587.000	9.580.872	99,93
2016K12-2848 Kütle Spektrometre Merkezi	2.000		200	1.800	1.800	100
2022K12-186897 Tümlleşik Araştırma Merkezleri-İdame	95.000.000			95.000.000	95.000.000	100
2024H03-233458 Büyük Onarım	49.300.000	25.000.000	4.930.000	69.370.000	0	0
2024K12-236077 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri		25.100.000		25.100.000	25.100.000	100
2024H03-232928 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	5.000.000	1.735.000	500.000	6.235.000	2.222.252,54	35,64
Kamulaştırma						
2024H03-233000 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	1.200.000	144.000	120.000	1.224.000	1.224.000	100
2024H05-233588 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bakım Onarım	20.000.000		4.000.000	16.000.000	998.400	6,24

Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı

Birim Adı	06.1 Mamul Mal Alımları	06.3 G.Maddi Hak Alımları	06.4 G.Menkul Alımları ve Kamulaştırma	06.5 G.Menkul Üretim Giderleri	06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	06.7 G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	Harcama Toplamı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	23.892.401,25				1.761.830,98		25.654.232,23
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	9.580.872,36						9.580.872,36
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				49.437.643,26		26.539.893,49	75.977.536,75
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	10.424.079,06	7.396.769,24					17.820.848,30
Rektörlük Özel Kalem	120.101.800						120.101.800
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı						998.400	998.400
Genel Toplam							250.133.689,64

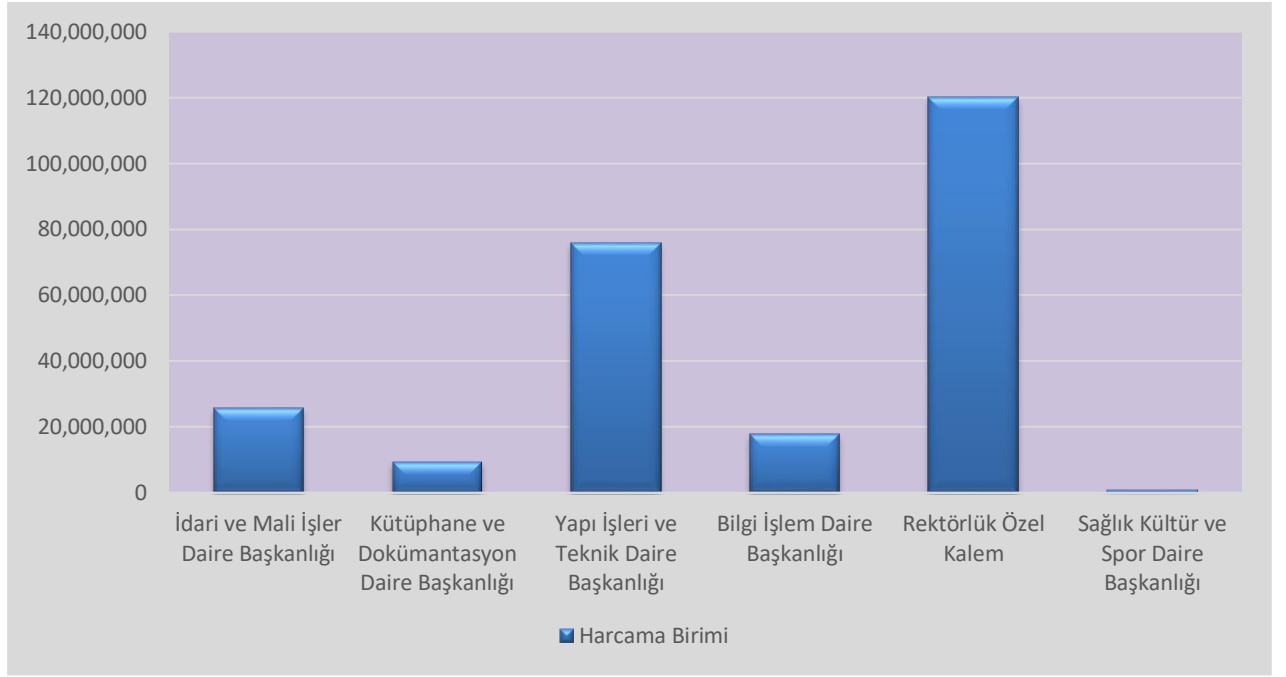

3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

3.1.1.1 2023H03-212407 Kampüs Altyapısı

	2020	2021	2022	2023	2024
Yılı Ödeneği	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.550.000	20.000.000
Eklenen (Likit/Ek Ödenek)					
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen					
Bloke					2.000.000
Harcama	1.000.000	1.500.000	1.438.897	2.185.200	11.215.461,60

2024 Yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;

İYTE Binalarının Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İşi 2024

Mühendislik Fakültesi A Blok'ta; projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, bina içinde ve dışında hissedilebilir yüzey, kaydırmaz bant, bina içi ve dışı yönlendirme tabelaları, asansör tabelaları, kat haritası ve kılavuz iz, kat bilgilendirme tabelaları, kapı isimlikleri imalatları yapılmıştır. Ana girişte engelli rampası imalatı yapılmıştır. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiş, mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi B Blok'ta; projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, bina içinde ve dışında hissedilebilir yüzey, kaydırmaz bant, bina içi ve dışı yönlendirme tabelaları, asansör tabelaları, kat haritası ve kılavuz iz, kat bilgilendirme tabelaları, kapı isimlikleri imalatları yapılmıştır. Ayrıca ana giriş kapısı yönetmeliğe uygun olarak genişletilmiştir. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiş, mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapılmıştır.

Diğer Kampüs İmalatları; Mimarlık fakültesi A Blokte bulunan kantinin zemin döşemesi erişilebilirlik standartları gereği kot farkı olmayacak şekilde yenilenmiş, dışarı açılan derslik binası kapısı yenilenmiştir. Kütüphane binası arka girişinde projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak ana giriş ve rüzgarlık kapıları imalatı ile engelli rampası yapılmıştır. Genel Kültür derslikleri binası ana girişinde projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak ana giriş kapısı ve rüzgarlık imalatı yapılmıştır.

Mühendislik A Blok Binasında (Kimya Müh.) 1 adet dikey makaslı tip asansör yaptırılmıştır. Mühendislik B Blok Binasında (Makine Müh.) engelli tuvalette varlık sensörü ve ipli çağrı sistemi takılmış olup bina genelinde de acil kaçış sistemi kurulmuştur.

3.1.1.2 2024H03-232928 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

	2020	2021	2022	2023	2024
Yılı Ödeneği	500.000	500.000	100.000	2.000.000	5.000.000
Eklenen (Likit)			600.000	1.670.000	1.735.000
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen		101.000			
Bloke					500.000
Harcama	227.532	399.000	29.570	1.934.948	2.222.252,54

- İYTE Lisansüstü Öğrenci Yurdu Binası Projeleri teslim alınarak kontrolleri yapıldı ve belediyeye ruhsat başvurusunda bulunuldu.
- İYTE 333 Ada 416 Parsel Aplikasyon Krokisi Ve Plan Örneği (Çap) Hazırlanması İşi
- İYTE 26 Hektarlık Alanda Karotlu Zemin Sondajı Yapılması İşi
- Mimarlık Fakültesi C Blok Karot Alınması işleri yapılmıştır.

3.1.1.3 2012H03-1581 Derslik ve Merkezi Birimler

3.1.1.3.1 Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı;

	2020	2021	2022	2023	2024
Yılı Ödeneği	7.300.000	8.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000
Eklenen (Likit)			25.000.000	21.000.000	
Bütçe İçi Aktarma					
Düşülen			2.500.000		
Bloke					4.000.000
Harcama	7.007.874	8.000.000	18.951.795	50.999.971	35.999.929,12

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir.

2024 sonu itibarı ile inşaatın %81'i tamamlanmıştır. Eksik olan duvar imalatları ve sıvaları tamamlanmıştır. Zemin ve 1. Katlarda saten alçı sıva imalatları yapıldı. Bodrum kat iç duvar boya imalatları yapılmıştır.

Mekanik tesisatta binanın havalandırma tesisatına ait klima santralleri temin edilmiş olup çatıdaki yerlerine konulmuştur. VRF tesisatına ait cihazlar temin edilmiş olup VRF dış üniteleri çatıdaki yerlerine konulmuştur. Sıhhi tesisatın boru montaj işi yapılmıştır. Yangın tesisatı çekildi. Havalandırma santral ve kanal imalatları yapıldı. Yangın ve temiz su depoları yerine konuldu. Çekerocaklara ait kanal imalatları tamamlandı. VRF iç ve dış üniteleri ile VRV imalatları yapılmıştır.

Binada sıva altı tesisat bulunan mahallerde borulama tesisatı yapılmıştır.

Bina bodrum katında tesisat galerisinin aydınlatma tesisatı yapılmış, led armatürleri takılmıştır. 2025 yılsonunda inşaatın tamamlanması ve 2026 yılında faaliyete alınması planlanmaktadır.



3.1.1.3.2 Yurt Binası –Lisansüstü Köyü İnşaatı

	2023	2024
Yılı Ödeneği	15.000.000	50.000.000
Eklenen (Likit)		15.000.000
Bütçe İçi Aktarma (Düşülen)		3.570.000
Düşülen		
Bloke		5.000.000
Harcama	0	0

2024 yılında proje işlemleri tamamlanarak kontrolleri yapıp teslim alınmıştır. 2025 yılında yapım ihalesine çıkmıştır.

3.1.1.4 2024H03-233015 Muhtelif İşler

	Yılı Ödeneği	Eklenen(L ikit)	Yedek Ödenek	Aktarma (Kurum İçi Eklenen)	Aktarma (Kurum İçi Düşülen)	Bloke
Büyük Onarım	8.700.000	12.974.000	15.000.000	5.200.000		4.500.000
Bilgi Teknolojileri	18.524.000				1.820.000	
Makina-Teçhizat	16.002.000	9.447.000		2.000.000	3.500.000	
Menkul Mal Büyük Onarım	1.774.000					
Toplam	45.000.000	22.421.000	15.000.000	7.200.000	5.320.000	4.500.000

Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye, tabloda detaylandırılan tertipler için 45.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde finans fazlası ve yedek ödenek ilave edilerek proje tutarı 79.801.000.- TL'ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2024 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

3.1.1.4.1 Büyük Onarım

	2020	2021	2022	2023	2024
Yılı Ödeneği	500.000	3.485.000	2.000.000	1.500.000	8.700.000
Eklenen (Likit)	2.750.000	1.160.000	1.000.000	19.400.000	12.974.000
Yedek Ödenek	770.000	1.200.000	14.000.000	10.000.000	15.000.000
Kurum İçi Aktarma (eklenen)			2.500.000		5.200.000
Bloke					4.500.000
Harcama	3.353.519	4.694.996	7.310.785,40	16.925.525,31	37.374.000

İYTE Kütüphane Tuvaletleri Onarımı İş

Kütüphane binasında yer alan 11 adet tuvalette tüm zemin ve duvar seramikleri, asma tavanlar, kapı ve pencereler, laminat tuvalet bölmeleri, tezgahlar, vitrifiyeler, armatür ve aydınlatmalar yenilenmiştir. 10 adet WC ve 1 adet Engelli WC'nin diğer işlerle birlikte elektrik altyapısı yeniden yapılmıştır. Ayrıca aydınlatma armatürleri LED armatürlere dönüştürülmüş, wclerde hareket sensörü, engelli wcde ise varlık sensörü ile aydınlatma anahtarlanacak şekilde yapılmıştır.

İYTE Yerleşkesindeki Binalarda Çatı Tadilat ve Tamiratların Yapılması İş

İYTE Kampüsü genelindeki 15 adet binada çatı yalıtım tadilat-tamiratları yapılmış olup, ayrıca bazı binaların dış cephelerinde silikon, alüminyum giydirme ve doğrama yalıtları yapılmıştır.

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ONARIM İŞLERİ

- Muhtelif Binalarda 4 Adet Onarım Yapılması İşi
- İYTE Su Deposuna Jeneratör Tesisatı Yapılması, Fen Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Jeneratörleri Arızalarının Giderilmesi İşi
- İYTE Lojmanlar Trafo Merkezi OG Hücrelerinin Değişimi İşi
- Gülbahçe Yerleşkesi Binalarına Ait Yangın Alarm Sistemleri ve Yangın Alarm Sistemi Grafik İzleme Yazılımı Bakım ve Onarımına İlişkin Sözleşme
- Gülbahçe Yerleşkesi Binalarına Ait Asansörlerin Aylık Bakım Sözleşmesi
- İYTE Su Deposu Ana Pano ve Kompanzasyon Panosu Yenilemesi İşi
- İYTE Kampüs İçi Yol Altyapı İşinin Yapılması
- Muhtelif Binalarda Temiz Su Hattı ve Pompa Onarımı İşinin Yapılması
- İYTE Kampüs İçi Binalarda Çeşitli Tamirat İşlerinin Yapılması İşi
- İYTE 5 Adet Onarım İşlerinin Yapılması İşi
- İYTE Laboratuvar Onarımı (HÜGÖM Lab.) ve Tezgah Yapılması İşi
- İYTE Kapalı Havuz Kazan Dairesi Demir İşleri ve Ümit Parkı Pano Kaidesi Yapılması İşleri
- İYTE Jeneratörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi
- İYTE Elektrik Tesisatı Onarım İşleri - 2024
- Fancoil Ve Klima Santrali Onarımı İşi
- Su Deposu Pompa Onarımı Ve Genleşme Tankı Yapılması İşi
- Kampus içi ana su hattı değişimi işi
- Mühendislik Fakültesi B Blok Pencere Açılması İşi
- TAM Binası ve Makina Mühendisliği VRF Onarımı İşinin Yapılması İşi
- Kimya Mühendisliği Binası Laboratuvar Lokal Emiş Kolu Yapım İşi
- Mimarlık Bölümü VRF Onarımı İşinin Yapılması İşi
- Merkezi Kafeterya Onarımı Yapılması İşi
- Fizik Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü Soğutma Grubu Onarımı İşi
- İYTE Mimarlık E Blok Saf Su Kanalı Açılması ve Merkezi Kafeterya Önü Yol Izgaralarının Onarımı İşi
- İnşaat Mühendisliği Bölüm Binasında Bulunan 3 Adet Krom Çelik Su Depolarının Tamir Edilmesi

- İYTE Gıda Mühendisliği Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yangın Deposu Onarımı İşi
- İYTE Erdal Saygın Amfi'sinde Bulunan Carrier Marka Çatı Klimesinin Tamir İşinin Yapılması
- İYTE Hidrolik Laboratuvarı Rüzgar Lülesi Platformu Yapılması
- İYTE Şenlik Alanına İlave Saha Panoları Yapılması ve Mühendislik Fakültesi F Blok Binası Armatürlerinin Led Armatürlerle Değiştirilmesi İşi
- İYTE Kütüphane Boya ve Kampüs İçi Tesisat Tamirat İşlerinin Yapılması
- Mart ve Haziran Yangın Santrali Bakım Eksikleri ve Onarımı işi
- İYTE Kampüs Tali Yol Güzergahında Deforme Olan Yol Izgaralarının Güçlendirilmesi İşi
- Mimarlık Fakültesi A ve B Bloкта Yer Alan Derslik Duvarlarının Onarım ve Boyasının Yapılması işi
- İYTE Lojmanlar, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Binaları jeneratörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi
- İYTE Elektrik Tesisatı Onarımı İşleri-2024-2
- İYTE Kampüs İçi Ana Su Hattı Boru Değişimi ve MBE Altyapı Pis Su Hat Değişimi
- İYTE Çeşitli Altyapı İşleri Yapılması
- İYTE Yabancı Diller Binaları Çevre Düzenleme İşinin Yapılması
- İYTE Trafo Merkezleri Periyodik Bakımında Tespit Edilen Arızaların Giderilmesi İşi
- İYTE Çeşitli Tesisat Onarım İşi
- İYTE Açık Spor Tesisleri Onarımı İşi
- İYTE Kütüphane Çalışma Salonları Yeni Masalara Elektrik Tesisatı Çekilmesi İşi
- İYTE Kampüs Etrafı Tel Çit Onarımı İşi
- İYTE Yabancı Diller Çevresi İstinat Duvarları Üzeri Çeşitli Demir İşleri Yapılması
- Yabancı Diller Yangın Merdivenlerinin Boyanması İşi
- İYTE Çevre Arge Binası Arkası altyapı Ve Yerleşke Genelinde Yapılan Elektrik Tesisatı İşi
- İYTE Mimarlık Fakültesi Yeni Park Alanına Aydınlatma Yapılması İşi
- İYTE Çeşitli Binalarda Temizsu Ve Hidrofor Hatları Onarımı İşi
- İYTE 300 Tonluk Ana Su Deposu Motorları Onarımı İşi
- İYTE Yabancı Diller Pencere Söveleri Ve Yağmur İnışleri Boyanması İşi
- İYTE Yabancı Diller İdari Bina Giriş Kısım Düzenleme İşi

- İYTE Yabancı Diller Binaları Cepheye Bulunan Yatay Ve Dikey Saçların Boyanması
- İYTE Yabancı Diller Binaları Yangın Merdiveni Basamak Ve Sahanlıkları Yenilenmesi İşi
- İYTE Merkezi Kafeterya Binası Onarım İşi
- İYTE Kampüs Onarım İşleri
- İYTE 2024 Yılına Ait Asansör Bakım, Arıza Eksiklikleri Ve Onarım İşi
- İYTE Eylül Ve Aralık Yangın Santrali Bakım Eksikleri Ve Onarım İşi
- İYTE Rektörlük Ve Tümleşik Araştırma Merkezi Jeneratörlerinin Arızalarının Giderilmesi İşi

İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2024-1

- 15 adet 15W SMD ledli, 75 cm yüksekliğinde aydınlatma armatürleri ile Ümit Parkının aydınlatması yapılmıştır.
- KYK Öğrenci Yurdu ile Lojmanlar arasındaki kavşağın aydınlatılması için golf sahasında yer alan projektörler kavşağa yönlendirilmiş ve astronomik röle ile aydınlatma kumandası yapılmıştır.
- Merkezi Kafeterya Binasında Kazan Dairesi Panosu ve Santral Panosunda yer alan arızalı kontaktörler ve faz koruma röleleri yenileriyle değiştirilmiştir.
- Mimarlık Fakültesinden Yurtlara doğru inen yol üzerinde bulunan aydınlatma direklerindeki 4 adet arızalı armatür çalışır hale getirilmiştir.
- Rektörlük Binası önüne 3 adet 36W, amber renkli wallwasher armatür takılmıştır.
- Tebessüm Parkındaki kırık olan 1 adet 33W led armatür yenisi ile değiştirilmiştir.
- Mimarlık Fakültesi B Bloкта yer alan VRF panosuna enerji analizörü takılmıştır.
- Merkezi Kafeterya Binasında Gıda Mühendisi Ofisi için data ve elektrik hattı çekilmiştir.
- Gıda Mühendisliği çatısında bulunan 16 adet arızalı projektör, yeni 150W IP66 led projektörlerle değiştirilmiştir.
- Erdal Saygın Amfisi Sahne aydınlatmasına ait arızalı olan 2 adet 650W CP/89 GY-9 ampul ile 10 adet PAR-30S 75W Dimli Led Spot ampul değiştirilmiştir.
- Şenlik Alanı yanı yaya yolu üzerinde ve zeytin ağaçları altında yer alan arızalı toplam 6 adet 9W yeşil renk wallwasher armatür yenileri ile değiştirilmiştir.
- Şenlik Alanındaki projektör direklerinde bulunan arızalı 2 adet projektör değiştirilmiştir.
- Kütüphane Binası ile Bilgisayar Mühendisliği Binası arasında yer alan Misafirhaneye Bilgisayar Mühendisliği Binasından 4 core SM fiber optik kablo çekilmiştir. Çekilen fiber optik kablonun her iki ucu da sonlandırılarak, Misafirhane tarafındaki sonlandırma için bina giriş duvarına 50x60x18 cm ölçülerinde harici tip switch panosu monte edilmiştir. Switch panosundan binadaki iki odaya 2'şer adet CAT6 zırlı data kablosu çekilerek internet bağlantısı sağlanmıştır.

- Kimya Mühendisliği Otoparkı ile Lojmanlar yolu üzerinde yer alan bollard armatürlerin arızalı olan toplam 50 adet ledi 5W cop led ile değiştirilmiştir. Yine çevre aydınlatmasında kullanılan ve arızalı olan 4 adet astronomik röle yenileri ile değiştirilmiştir.

İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2024-2

- Gözlem Evi'ne elektrik tesisatı yapılmıştır.
- Gözlem Evi'nin giriş yolunun kenarına 3 adet 75cm yüksekliğinde, IP65, 15W SMD Led Bollard armatür ile aydınlatma yapılmıştır.
- Gözlem Evi'ne internet bağlantısı için Mimarlık Fakültesi E Bloktan 4 core SM fiber optik kablo çekilmiştir. Bina içine 7U kabinet konulup, fiber optik kablo kabinet içine konulan fiber patch panelde sonlandırılmıştır. Ayrıca kabinet içerisinde 24 port 10/100/1000 Gigabit 2SFB yönetilebilir switch konulmuştur.
- Gözlem Evi içerisindeki 2 odaya birer tane 2.8mm 4MP Colorvu Dom kamera, bina girişinin köşelerindeki 2 adet 6mt'lik 40x40mm profil direklere ise 4MP IR Bullet kamera monte edilmiştir.
- Gözlem Evi girişindeki ilk odaya Indoor Access Point cihazı konulmuştur.
- Gözlem Evi'ndeki kameralara ve Access Point cihazına switchden CAT6 outdoor kablo çekilmiştir.
- Çeşme Kapısı Güvenlik Kulübesinin kopan 12 core SM fiber optik kablosuna ek yapılmıştır.
- Mühendislik Fakültesi E Blok (Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümü) Binasında bulunan 5 adet laboratuvarı, acil durumlarda elektrik enerjisini kesmek üzere kutulu acil stop butonları monte edilmiştir.
- 212 adet yol aydınlatma armatürünün kontrol ve bakımları yapılarak, arızaları giderilmiştir.

İYTE KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SALONLARI YENİ MASALARINA ELEKTRİK TESİSATI ÇEKİLMESİ İŞİ

- Kütüphane binasındaki Z-40 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir.
- Kütüphane binasındaki Z-50 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir.
- Kütüphane binasındaki 1-41 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir.
- Kütüphane binasındaki 1-55 çalışma salonuna konulan yeni masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir.
- Kütüphane binasındaki 1-41 ve 1-55 çalışma salonları arasındaki koridora (1-64) konulan masalar üzerinde yer alan prizlere elektrik tesisatı çekilmiştir.
- 1-41 salonuna, 1-55 salonuna, 1-64 koridoruna ilave yeni panolar konulmuştur.
- 1-41 salonu ve 1-55 salonunda yer alan mevcut panolardan yeni panolara 4x16mm² N2XH+16mm² Cu kablo çekilmiştir.

- Mevcut ana panodan 1-64 koridoruna konulan yeni panoya 4x10mm² N2XH+10mm² Cu kablo çekilmiştir.

İYTE MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ PARK ALANINA AYDINLATMA YAPILMASI İŞİ

- Mimarlık Fakültesi yeni park alanına aydınlatma tesisatı yapılmıştır. Bunun için 36 adet, 15W SMD ledli, 75 cm yüksekliğinde aydınlatma armatürü monte edilerek gerekli kablolama imalatı yapılmıştır.
- Park alanına saha panosu konularak, panoya Mimarlık Trafosu AG panosundan 4x16mm² NYY besleme hattı çekilmiştir.

İYTE ŞENLİK ALANINA İLAVE SAHA PANOLARI YAPILMASI VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ F BLOK BİNASI ARMATÜRLERİNİN LED ARMATÜRLERLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ

- Şenlik Alanına ilave 7 adet, 50x70x22 mm ölçülerinde, elektrostatik boyalı sac saha panosu konulmuştur.
- Her saha panosuna, 5x6 mm² NYY kablo ile besleme hattı çekilmiştir.
- Şenlik alanı Ç-APD panosu üzerine 5x125A makina prizi ve fişi takılmıştır.
- Mühendislik Fakültesi F Blokda bulunan 4x18W floresan armatürler, 600 adet 36W led armatürle değiştirilmiştir. Koridorlarda yeni takılan led armatürlere 45 adet acil aydınlatma kiti takılmıştır. Tuvaletlerde bulunan ayna üstü floresan armatürler 45 adet led armatür ile değiştirilmiş, tavanda bulunan floresan armatürler ise mevcut kasalara led ve sürücü monte edilerek revize edilmiştir.

İYTE JENERATÖRLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

- Lojmanlar jeneratörünün arızalı olan yakıt otomatığı yenisi ile değiştirilmiştir.
- Tümleşik Araştırma Merkezi Binası jeneratörünün arızalı olan aküleri yerine 4 adet 105 Ah akü takılmıştır.
- Mimarlık Fakültesi jeneratörünün arızalı olan aküleri yerine 2 adet 180 Ah akü takılmıştır.
- Moleküler Biyoloji ve Matematik Binalarını besleyen jeneratörün arızasının giderilmesi için aşağıda belirtilen parça değişim işlemleri yapılmıştır.

Housing	2 Adet
Spindle	1 Adet
Oil Seal	2 Adet
Bearing	2 Adet
Retaining Plate	2 Adet
Motor V kayışları	4 Adet

İYTE SU DEPOSUNA JENERATÖR TESİSATI YAPILMASI, FEN FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ JENERATÖRLERİ ARIZALARININ GİDERİLMESİ

İŞİ

- 100m³'lük su deposuna prime 100kVA gücünde jeneratör tesis edilmiştir.
- Fen Fakültesi Trafo Merkezinde bulunan jeneratörün, çürümüş olan radyatörü yenisi ile değiştirilmiştir.
- Mimarlık Fakültesi Trafo Merkezinde bulunan jeneratörün, arızalı olan termostat ve hararet müşürü yenisi ile değiştirilmiştir.

İYTE SU DEPOSU ANA PANO VE KOMPANZASYON PANOSU YENİLENMESİ İŞİ

- 300m³'lük su deposunun korozyona uğramış, eskimiş olan trafo AG panosu yenilenmiştir.
- Kompanzasyon panosu tüm malzemeleri (kondansatör, kontaktör, reaktif röle, sigorta vs.) ile birlikte yenilenmiştir.

İYTE LOJMANLAR TRAFİ MERKEZİ OG HÜCRELERİNİN DEĞİŞİMİ İŞİ

- Lojmanlar Trafo Merkezinde bulunan arızalı 3 adet OG (Orta Gerilim) hücresi değiştirilmiştir. Arızalı hücreler yerine, 2 adet 36kV, 630A, 20kA yük ayırıcılı hücre, 1 adet 36kV, 630A, 20kA sigortalı yük ayırıcılı hücrenin montajı yapılmıştır.

İYTE LOJMANLAR, MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİNALARI JENERATÖRLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

- Lojmanlar jeneratörünün arızalı olan 2 adet 135Ah aküsü yenileri ile değiştirilmiştir.
- Lojmanlar trafo merkezinde bulunan jeneratörün radyatörü sökülerek şişlenip temizlenmiştir.
- Kimya Mühendisliği Binasında bulunan jeneratörün radyatörü sökülerek şişlenip temizlenmiştir.
- Makina Mühendisliği Binasında bulunan jeneratörün radyatörü sökülerek şişlenip temizlenmiştir.

İYTE REKTÖRLÜK VE TÜMLEŞİK ARAŞTIRMA MERKEZİ JENERATÖRLERİNİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

- Rektörlük jeneratörünün arızalı olan yakıt solenoidi (24V) değiştirilmiştir.
- Rektörlük jeneratörünün arızalı olan yağ müşürü (10 bar basınçlı) değiştirilmiştir.
- Rektörlük jeneratörünün arızalı olan hararet müşürü (120 °C) değiştirilmiştir.
- Rektörlük jeneratörünün arızalı olan kontrol paneli (CAT marka 350kVA için) değiştirilmiştir.
- Rektörlük jeneratörünün arızalı olan 2 adet sürücü kontaktörü (9kW, 18A, 3 kutuplu) değiştirilmiştir.
- Tümleşik Araştırma Merkezi jeneratörünün arızalı olan yağ basınç sensörü değiştirilmiştir.

İYTE TRAFİ MERKEZLERİ PERİYODİK BAKIMINDA TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ İŞİ

- Mimarlık Fakültesi Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu (18Ah) yenisi ile değiştirilmiştir.
- Fen Fakültesi Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu (18Ah) yenisi ile değiştirilmiştir.
- Mediko Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu (18Ah) yenisi ile değiştirilmiştir.
- Su Deposu Trafo Merkezi orta gerilim hattındaki (OG) arıza giderilmiştir.

İYTE MART VE HAZİRAN YANGIN SANTRALİ BAKIM EKSİKLERİ VE ONARIM İŞİ

Mart ve Haziran aylarında yapılan Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin bakımı kapsamında;

- 2 adet akıllı adresli optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü
- 1 adet loop kartı
- 2 adet adresli yangın alarm butonu resetlenebilir, kısa devre izolatörlü
- 10 adet 12V 7A Akü
- 1 adet akıllı adresli röle kontrol modülü, 1 çıkışlı
- 1 adet akıllı adresli sistem kontak izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü
- 4 adet akıllı adresli optik duman dedektörü
- 1 adet akıllı adresli dedektör soketi olmak üzere parçalar değiştirilmiştir.

İYTE EYLÜL VE ARALIK YANGIN SANTRALİ BAKIM EKSİKLERİ VE ONARIM İŞİ

Eylül ve Aralık aylarında yapılan Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin bakımı kapsamında;

- 1 adet SMPS Anahtarlama Güç Kaynağı (kabin ile birlikte) (Y202-1 ad.)
- 1 adet Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü (Eski Seri) (Y606-1 ad.)
- 15 adet Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü (Y303-1 ad.) (Y305-11 ad.) (Y604-2 ad.)
- 2 adet Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü Alıcı Verici dahil (Y303-1 ad.) (Y606-1 ad.)
- 8 adet 12V 7A Akü (Y301-2 ad.) (Y401-2 ad.) (Y604-2 ad.) (Y606-2 ad.)
- 2 adet 12V 5A Akü (Y105-2 ad.)
- 1 adet Akıllı Adresli Sistem Kontak İzleme Modülü, 1 Giriş (Y601-1 ad.)
- 1 adet Akıllı Adresli Gaz Dedektörü (Y601-1 ad.)
- 1 adet Akıllı Adresli GCU Modülü + SGC Modülü (Y604-1 ad.) olmak üzere parçalar değiştirilmiştir.

İYTE 2024 YILINA AİT ASANSÖR BAKIM, ARIZA EKSİKLERİ VE ONARIM İŞİ

2024 yılında yapılan Asansör bakımları kapsamında;

- 4 adet Elektronik Mono Bistabil (A604-3 ad.) (A108-1 ad.)
- 5 adet Paten Bloğu (A604-1 ad.) (A502-1 ad.) (A302-3 ad.)
- 4 adet Mıknatıs Şerit (A604-4 ad.)
- 2 adet Modül Kartı + Frekans Kontrol Cihazı 7.5 kW (A501-1 ad.) (A604-1 ad.)
- 2 adet Dişlisiz Motor Enkoderi + Enkoder Bağlantı Flaşı + Enkoder Gergi Lastiği (A501-1 ad.) (A604-1 ad.)
- 1 adet Tahrik Kasnağı (400 – 460 mm. kadar) (A202-1 ad.)
- 5 adet Boy Fotoseli (A402-1 ad.) (A607-1 ad.) (A303-1 ad.) (A502-1 ad.) (A202-1 ad.)
- 1 adet Otomatik Kabin Kapı Halatı (A109-1 ad.)
- 4 adet Kabin Ray Kılavuz Tekerli Tekli Rulmanlı Eksantrik Dahil (A109-2 ad.) (A403-2 ad.)
- 2 adet Otomatik Kabin Kapısı Kayış Birleştirme (Tutucu) (A109-2 ad.)
- 1 adet Kumanda Butonu – Mikro Hareket (A402-1 ad.)
- 1 adet Elektronik Ana Kumanda Kartı (A604-1 ad.)

- 1 adet Seri Haberleşme Kartı (A604-1 ad.) olmak üzere parçalar değiştirilmiştir.

İYTE ÇEVRE ARGE BİNASI ARKASI ALTYAPI VE YERLEŞKE GENELİNDE YAPILAN ELEKTRİK TESİSAT İŞİ

- Tam Binasına giden temiz su ana hattından Çevre Arge Binasına doğru yeni hat alınarak uç kısmına vana konulmuştur. Bina köşesine 1 adet rögar konulacak ve konulan rögardan koruge boru ile otopark içerisinde bulunan rögara bağlantı yapılmıştır.
- Çevre Arge Binası arkasına trafo binasından 4x35 mm² NYY besleme hattı çekilmiştir. Trafo binasında 3x63 A TMŞ ana sigorta olarak tesis edilmiştir. Binadan 8 core fiber optik kablo ve 1x2x0,8+0,8 JE-H(st) H FE180 yangın kablosu çekilmiştir. Besleme kablosu 70lik koruge boru, zayıf akım kabloları 35lik koruge boru içerisinde tesis edilerek uygun kanaldan götürülecek olup menhol bırakılmıştır.
- Prof.Dr. Mustafa GÜDEN'in 14.10.2024 tarihli dilekçesine (Evrak Kayıt Tarihi: 15.10.2024 – Sayı: 2400062919) istinaden Dinamik Test ve Modelleme Laboratuvarında yeni alınan 40 kW gücündeki fırına panodan 4x35 mm² N2XH besleme kablosu ve 25 mm² TTR topraklama kablosu çekilmiştir. Panoya 160 A 36kA TMŞ koyulacaktır. Tesisat 50x100 mmm PVC kablo kanalı içerisinde tesis edilmiştir.
- Bina çatısında bulunan 7 adet projektörün tamiraty yapılmıştır

3.1.1.4.2 Bilgi Teknolojileri

Enstitümüz 2024 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojilerine 7.000.000 TL yazılım, 11.524.000 TL donanım alımları olmak üzere toplam 18.524.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Yazılım Alımları

Yıl	2020	2021	2022	2023	2024
Ödeneği	600.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000
Eklenen	361.000	132.000	4.000.000		
Düşülen					820.000
Harcama	939.007	1.122.056	2.337.233,40	4.673.570,34	6.172.769,24

Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, kampüs işletim sisteminin güncellenmesi için 7.000.000.-TL ödenek verilmiş, toplam ödeneğin 6.172.769,24- TL tutarı harcanmıştır.

Bilgisayar Alımları

Yılı	2020	2021	2022	2023	2024
Ödeneği	242.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	11.524.000
Eklenen	2.000.000	1.935.000	3.500.000	3.000.000	
Düşülen					1.000.000
Harcama	242.000	2.932.970,24	930.963,86	4.490.729,10	10.424.079,06

Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 11.524.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödenekten 1.000.000.-TL ödenek Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesine Aktarılmış ve kalan ödeneğin 10.424.079,06- TL'si harcanmıştır.

3.1.1.4.3 Makina ve Teçhizat Alımı

	2020	2021	2022	2023	2024
Yılı Ödeneği	600.000	3.000.000	1.000.000	7.000.000	16.002.000
Eklenen (Likit)	2.500.000	1.160.000	1.527.000	350.000	9.447.000
Ek Ödenek	75.000	1.200.000	8.500.000	10.000.000	
Düşülen					3.500.000
Aktarma(kurum içi eklenen					2.000.000
Harcama	2.233.485	4.422.549	10.986.376,59	6.902.935,51	23.892.401,25

Enstitümüz makina - teçhizat alımları için 2024 yılında 16.002.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak ve Amfilerin mefruşat alımlarını gerçekleştirmek üzere 9.447.000.-TL finans fazlası ve 2.000.000.-TL kurum içi aktarma ile ödenek eklemesi yapılmış ve yıl içinde toplam ödenekten 23.892.401,25- TL harcama yapılmıştır.

3.1.1.4.4 Menkul Malların Büyük Onarımı

	2023	2024
Yılı Ödeneği	0	1.774.000
Eklenen (Likit)	570.000	
Ek Ödenek		
Düşülen		
Harcama	558.932,00	1.761.830,98

Enstitümüz araçlarının bakım onarım giderlerinde kullanılmak üzere, yıl içerisinde Menkul Malların Büyük onarımı tertibine 1.774.000-TL ödenek tahsis edilmiş, ödeneğin tamamına yakını harcanmıştır.

3.1.1.5 2024H03-232919 Yayın Alımları

Yayın Alımları

Yıl	Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme
2020	1.500.000	1.500.000	%100
2021	2.000.000	2.033.000	%100
2022	3.400.000	3.400.000	%100
2023	5.000.000	6.500.000	%130
2024	9.500.000	9.580.872,36	%101

2024 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 9.500.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneye 950.000' i tasarruf tedbirleri gereği kesintiye uğramış, 1.037.000 likit eklemesi yapılmış olup aşağıdaki tabloda belirtilen alımlar için mevcut ödeneğin 9.580.872-TL ' si harcanmıştır.

Kütüphane Kaynakları

Materyal Adı	2020	2021	2022	2023	2024
Toplam Kitap	57.467	58.161	58.906	59.344	59.619
Satın Alınan Kitap	61	12	69	80	275
Toplam Elektronik Kitap	403.688	442.250	516.557	506.977	536,824
Abone Olunan Veri Tabanı	85	82	78	83	86
Abone Olunan Güncel Basılı Dergi	39	25	20	15	13

Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu	2.123	2.354	2.562	2.784	3.014
Abone Olunan Elektronik Dergi	67.629	68.509	73.089	70.102	70.817
Multi Medya Materyal	7.091	7.091	7091	7.091	7.091

3.1.1.6 2024H03-233000 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

	2024
Yılı Ödeneği	1.200.000
Eklenen (Likit)	24.000
Bütçe İçi Aktarma	120.000
Düşülen	120.000
Harcama	1.224.000

2024 yılında üniversite bilgi yönetim sistemi için 1.200.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içi işlemler ile toplam ödene 1.224.000-TL ye ulaşmış ve bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

3.1.1.7 2024H03-233458 Büyük Onarım- Fen A-B-C Blok Güçlendirme

	2024
Yılı Ödeneği	49.300.000
Eklenen (Likit)	25.000.000
Bloke (düşülen)	4.930.000
Düşülen	
Harcama	0

Fen Fakültesi A–B–C Blok Güçlendirme ve Onarım İşi

Fen Fakültesi A-B-C Blok güçlendirme ve onarımı işi ihalesi 08.10.2024 tarihinde yapılmış olup sözleşmesi 30.10.2024, yer teslimi 01.11.2024 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşme bedeli 173.900.000 TL dir.

Projesine uygun olarak her üç blokta güçlendirme perdesi ile kolon mantolaması yapılacak kısımlarda duvar kırılmaları ve kolonlarda sıyırma imalatları yapılmıştır. B ve C blokta kapı ve kısmi olarak döşeme kaplamalarının sökümleri yapılmıştır. B1 Bloкта epoksi ile filiz ekimleri tamamlanarak perde ve kolon mantolama demir imalatlarına başlanmıştır.

2024 yılı içinde ihalesi yapılan iş kapsamında B ve C Bloklardaki mevcut elektrik tesisatının demontajı yapılmıştır.



3.1.1.8 20223H05-214620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

	2020	2021	2022	2023	2024
Yılı Ödeneği	250.000	250.000	-	500.000	20.000.000
Eklenen (Likit)					
Bloke(düşülen)					2.000.000
Düşülen					2.000.000
Harcama	206.972	250.000	-	172.536	998.400

Kapalı yüzme havuzu pompalarının bakım ve onarım işleri ile stadyum inşaatı için toplamda 20.000.000-TL ödenek verilmiş tasarruf tedbirleri gereği bu ödeneğin 2.000.000-TL sine bloke koyulmuştur, 2.000.000-TL si muhtelif işler makine ve teçhizat alımlarına aktarılmış kalan ödeneğin 998.400-TL si bakım onarım işlerinde kullanılmış, stadyum inşaatına 2024 yılında başlanmamıştır.

4. 2024 Yılı Yatırım Programı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ					-	715.250.000	-	86.550.000	-	220.000.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
a) 2024 yılında bitenler					-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
2024H03-232928	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	İzmir	Etüt-Proje	2024-2024		5.000.000				5.000.000

PROJE SAHİBİ: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. - JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI - KAFKAS ÜNİ.

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2023 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2024 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	492.550.000	-	86.550.000	-	110.000.000
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	492.550.000	-	86.550.000	-	110.000.000
2012H03-1581	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Eğitim (9.925 m²), Yurt İnşaatı (10.662 m²)	2012-2026		460.000.000		84.000.000		90.000.000
	Fen Fakültesi Laboratuvar Binası	İzmir	Eğitim (9.925 m²)	2015-2025		170.000.000		84.000.000		40.000.000
	Yurt Binası	İzmir	Yurt İnşaatı (10.662 m²)	2023-2026		290.000.000				50.000.000
2023H03-212407	Kampüs Altyapısı	İzmir	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025		32.550.000		2.550.000		20.000.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	217.700.000	-	-	-	105.000.000
a) 2024 yılında bitenler					-	55.700.000	-	-	-	55.700.000
2024H03-232919	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024		9.500.000				9.500.000
2024H03-233000	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	İzmir	BIT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2024-2024		1.200.000				1.200.000
2024H03-233015	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım, BIT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-10 (1 adet)	2024-2024		45.000.000				45.000.000
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	162.000.000	-	-	-	49.300.000
2024H03-233458	Büyük Onarım	İzmir	Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon	2024-2026		162.000.000				49.300.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI					-	135.000.000	-	-	-	39.000.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	135.000.000	-	-	-	39.000.000
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	135.000.000	-	-	-	39.000.000
2023H03-197363	Birinci Basamak Sağlık Merkezi	Ankara	Hizmet Binası (500 m²)	2023-2025		15.000.000				9.000.000
2023H03-197366	Saymanlık Deposu	Ankara	Hizmet Binası (3.000 m², 2 adet)	2023-2026		90.000.000				20.000.000
2023H03-197971	Bilgi İşlem Merkezi MEBS Binası	Ankara	Hizmet Binası (1.000 m²)	2023-2025		30.000.000				10.000.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ					-	414.900.000	-	60.000.000	-	130.000.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
a) 2024 yılında bitenler					-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
2024H03-232932	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kars	Etüt-Proje	2024-2024		1.000.000				1.000.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	189.900.000	-	60.000.000	-	50.000.000
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	189.900.000	-	60.000.000	-	50.000.000
2008H03-933	Derslik ve Merkezi Birimler [546]	Kars	Eğitim (23.078 m²)	2008-2025		189.900.000		60.000.000		50.000.000
	Meslek Yüksek Okulu Kompleksi	Kars	Eğitim (15.000 m²)	2017-2025		97.900.000		53.000.000		25.000.000
	Hayvan Sağlığı ve Uygulama Merkezi	Kars	Eğitim (8.078 m²)	2017-2025		92.000.000		7.000.000		25.000.000

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ					-	71.000.000	-	-	-	20.000.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	71.000.000	-	-	-	20.000.000
b) 2024 yılından sonraya kalanlar					-	71.000.000	-	-	-	20.000.000
2024H05-233588	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Bakım Onarım, Makine-Teknik, Stadyum (4.500 seyirci kapasitesi)	2024-2026	71.000.000					20.000.000
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Bakım Onarım, Makine-Teknik, Stadyum (4.500 seyirci kapasitesi)	2024-2026	71.000.000					20.000.000

• • •

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ					-	161.692.000	-	66.690.000	-	95.002.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	161.692.000	-	66.690.000	-	95.002.000
a) 2024 yılında bitenler					-	161.692.000	-	66.690.000	-	95.002.000
2016K12-2848	Kütle Spektrometre Merkezi	İzmir	Makine-Teknik, Teknolojik Araştırma	2016-2024	27.092.000		27.090.000			2.000
2022K12-186897	Tümleşik Araştırma Merkezleri- İdame	İzmir	Mak.Teç.Bak.On., Makine-Teknik, Teknolojik Araştırma	2022-2024	134.600.000		39.600.000			95.000.000

4.1. 2024 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı

2024 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

KURULUŞLAR	TARIM	MADENCİLİK	İMALAT	ENERJİ	ULAŞTIRMA HABERLEŞME	TURİZM	KONUT	EĞİTİM	SAĞLIK	DKH-İKTİSADİ	DKH-SOSYAL	TOPLAM
İLETİŞİM BŞK.					145.000.000							145.000.000
İNÖNÜ ÜNİ.								286.000.000	232.000.000		20.839.000	538.839.000
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ.								155.500.000			17.000.000	172.500.000
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ.								144.200.000	24.175.000			168.375.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.								286.000.000			25.843.000	311.843.000
İSTANBUL ÜNİ.								1.452.000.000	750.000.000		48.637.000	2.250.637.000
İSTANBUL ÜNİ.- CERRAHPAŞA								943.001.000	507.500.000		33.830.000	1.484.331.000
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ.								136.000.000			12.000.000	148.000.000
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ.								183.500.000				183.500.000
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.								180.000.000	140.000.000		2.000	320.002.000
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.								240.000.000			95.002.000	335.002.000
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.								240.000.000			95.002.000	335.002.000
